


НАВЕС С ХОЗБЛОКОМ

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

26

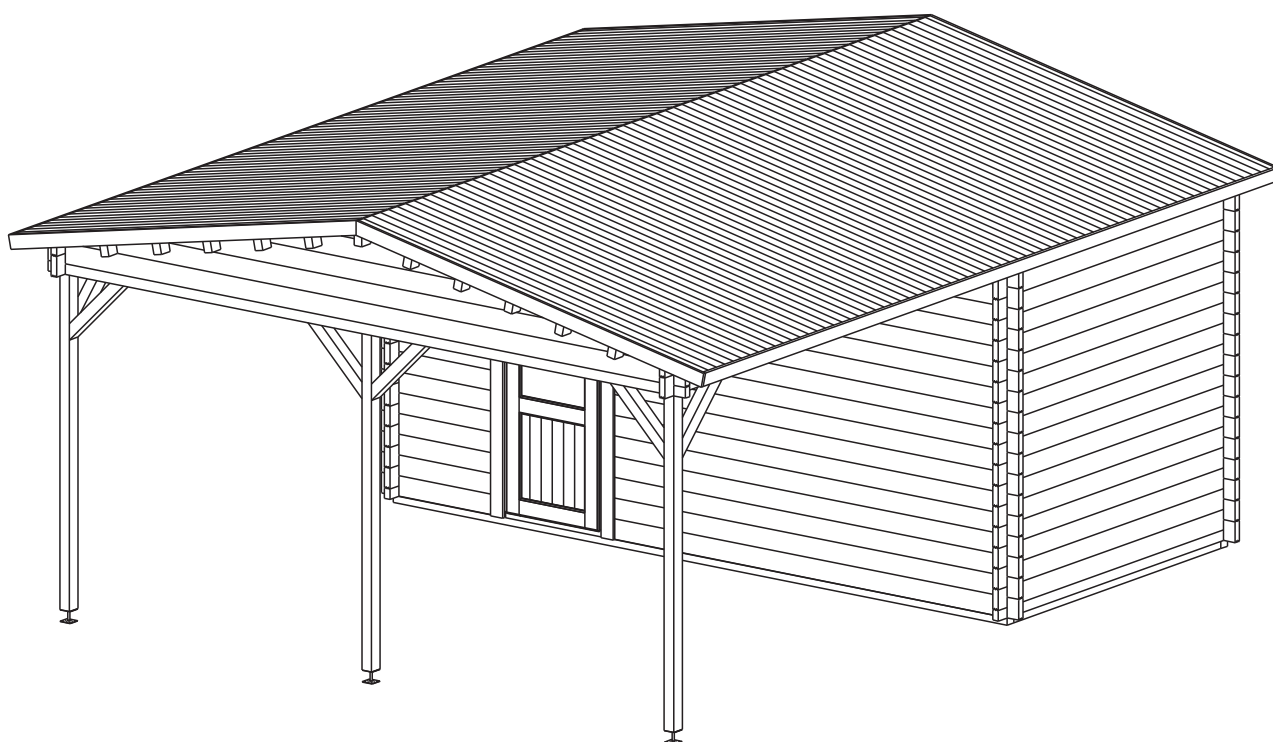

6×5

44 mm


ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СБОРКИ

- | | | |
|------------|----------------|---|
| 1. Молоток | 5. Перчатки | 9. Уровень |
| 2. Пила | 6. Лестница | 10. Бита «звездочка» |
| 3. Киянка | 7. Шуруповерт | 11. Сверло Ø5 мм,
длиной не менее 180 мм |
| 4. Рулетка | 8. Плоскогубцы | |




ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ


Садовый дом произведен согласно СТО 72746455-3.13.2-2025.

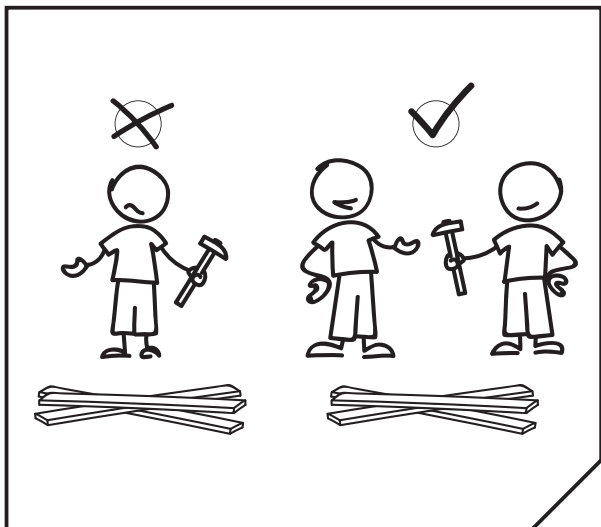

Сборку комплекта строения рекомендуется выполнять в количестве 2-х человек, с привлечением помощника.

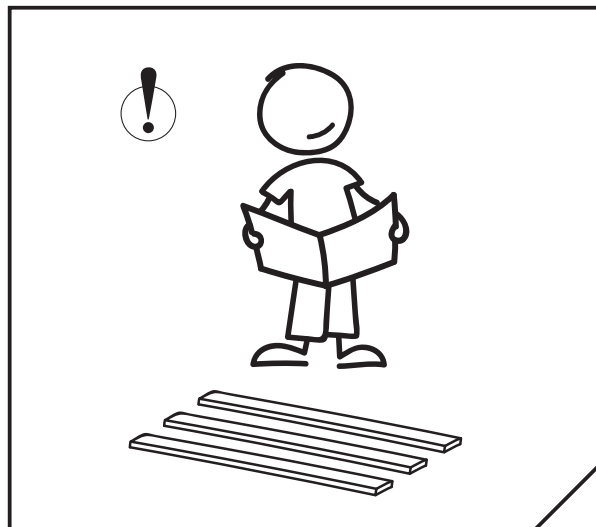


Перед началом сборки необходимо тщательно ознакомиться с Инструкцией.

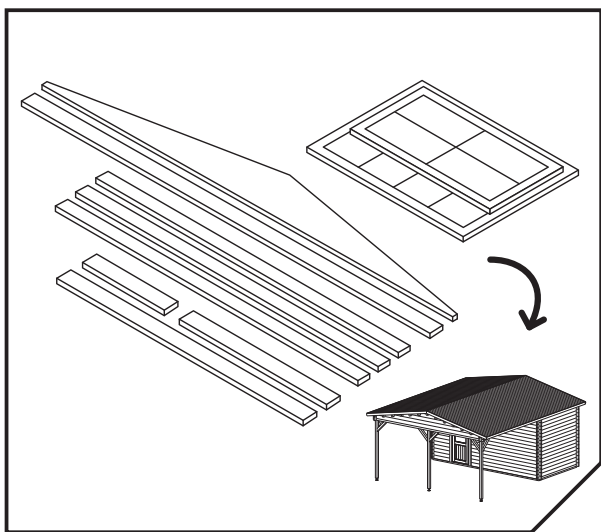

Детали комплекта следует разложить в соответствии со спецификацией по номерам согласно порядку сборки.

При заказе комплектации «Стандарт» пропустите пункт №21 «Установка окон и дверей» данной инструкции.

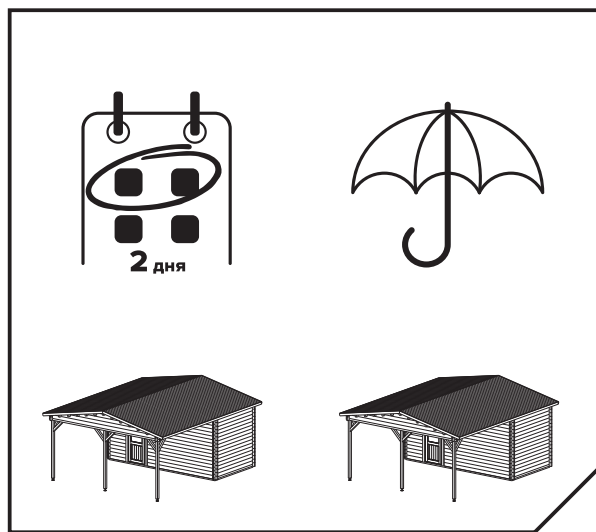

Соберите готовое изделие в течение двух дней после распаковки.

В случае увеличения срока сборки рекомендуется защищать строение от прямого воздействия атмосферных осадков.

Более подробная информация приведена в спецификации продукта.

ФУНДАМЕНТ

В качестве основания строения допускается использовать любой вид фундамента, который будет обеспечивать его надёжность и долговечность: ленточные мелкозаглубленные фундаменты, свайный с деревянным обвязочным ростверком или в виде сплошной плиты.

Комплектом поставки предусмотрены антисептированные элементы каркаса пола (подкладочный брус и лаги), которые необходимо закрепить к сплошному основанию (фундаментная плита).





При выборе в качестве основания строения ленточного или свайного фундамента необходимо дополнительно смонтировать несущие конструкции цокольного перекрытия. Рекомендуется применять деревянные доски сечением не менее 50×150 мм, установленные с шагом не более 600 мм вдоль короткой стороны строения. В таком случае доски необходимо обработать антисептирующими составами согласно рекомендациям производителей таких составов.










Строения временного, не ответственного характера допускается монтировать на фундаментные полнотелые цементно-песчаные блоки размером не менее 200×200×400 мм, установленные по периметру стен.

В местах опирания стен строения на фундамент необходимо укладывать гидроизолирующие прокладки в 2 слоя.

Выбор вида фундамента зависит от инженерно-геологических условий строительной площадки. Компания ТЕХНОНИКОЛЬ не несёт ответственности за нарушение конструкции строения из-за некачественного фундамента.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ДЕТАЛЕЙ

№	Наименование	Размеры, мм			Кол-во, шт.	Схематичное отображение (примечание)
		Толщина	Ширина	Длина		
1	Лага	47	47	4675	3	
2	Подкладочный брус	47	70	2175	2	
3	Подкладочный брус	47	70	4815	2	
4	Стеновой брус	44	67	2500	2	
5	Стеновой брус	44	68	5000	1	
6	Стеновой брус	44	132	6000	1	
7	Стеновой брус	44	132	6000	1	
8	Стеновой брус	44	135	926	20	
9	Стеновой брус	44	135	2500	32	
10	Стеновой брус	44	135	2704	7	
11	Стеновой брус	44	135	3224	13	
12	Стеновой брус	44	135	5000	14	
13	Стеновой брус +1 доп.	44	135	6000	3	
14	Прогон	60	142	6000	1	
15	Прогон	60	142	6000	10	
F1	Фронтон			5000	3	
16	Стойка	90	75	2345	1	

№	Наименование	Размеры, мм			Кол-во, шт.	Схематичное отображение (примечание)
		Толщина	Ширина	Длина		
17	Стойка	90	75	2345	1	
18	Стойка	90	75	2345	1	
19	Раскос	90	75	700	1	
20	Раскос	90	75	700	2	
21	Раскос	90	75	700	2	
22	Раскос	90	75	700	1	
23	Настил крыши + 2 доп. (2 ската 2755×6000 мм)	88	28	2755	140	
24	Брусок	47	47	6000	2	
25	Лобовая доска	20	94	2950	4	
26	Лобовая доска +2 доп.	20	94	6000	4	
27	Настил пола +1 доп. (2220×4720 мм)	28	88	2220	56	
28	Плинтус	18	44	6000	3	
D1	Дверь стекло (проем 850×2025) мм		830	1975	1	 Открытие левое
WS1	Окна двойное (проем 1370×1071 мм)		1350	1040	1	 Открытие правое


ФУРНИТУРА И КРЕПЕЖ

Наименование	Единица измерения	Итого на 1 компл.
Саморез 6×200 мм	шт.	355
Саморез 6×120 мм	шт.	40
Саморез 5×70 мм	шт.	60
Саморез 3,5×41 мм	шт.	255
Гвоздь ершый 2,5×60 мм	кг	6,45
Опора регулируемая по высоте 80×80 мм	шт.	3

ВАЖНО: перед вкручиванием самореза диаметром 6 мм (и более), предварительно просверлить отверстие диаметром 5 мм на глубину, равную гладкой (без резьбы) части стержня самореза. При вкручивании утопить головку самореза в брус на глубину не менее 5 мм.



Саморез
6×200



Саморез
6×120




Саморез
5×70



Саморез
3,5×41




Гвоздь ершый
2,5×60





Опора регулируемая
по высоте 80×80

ПЛАНИРОВКА

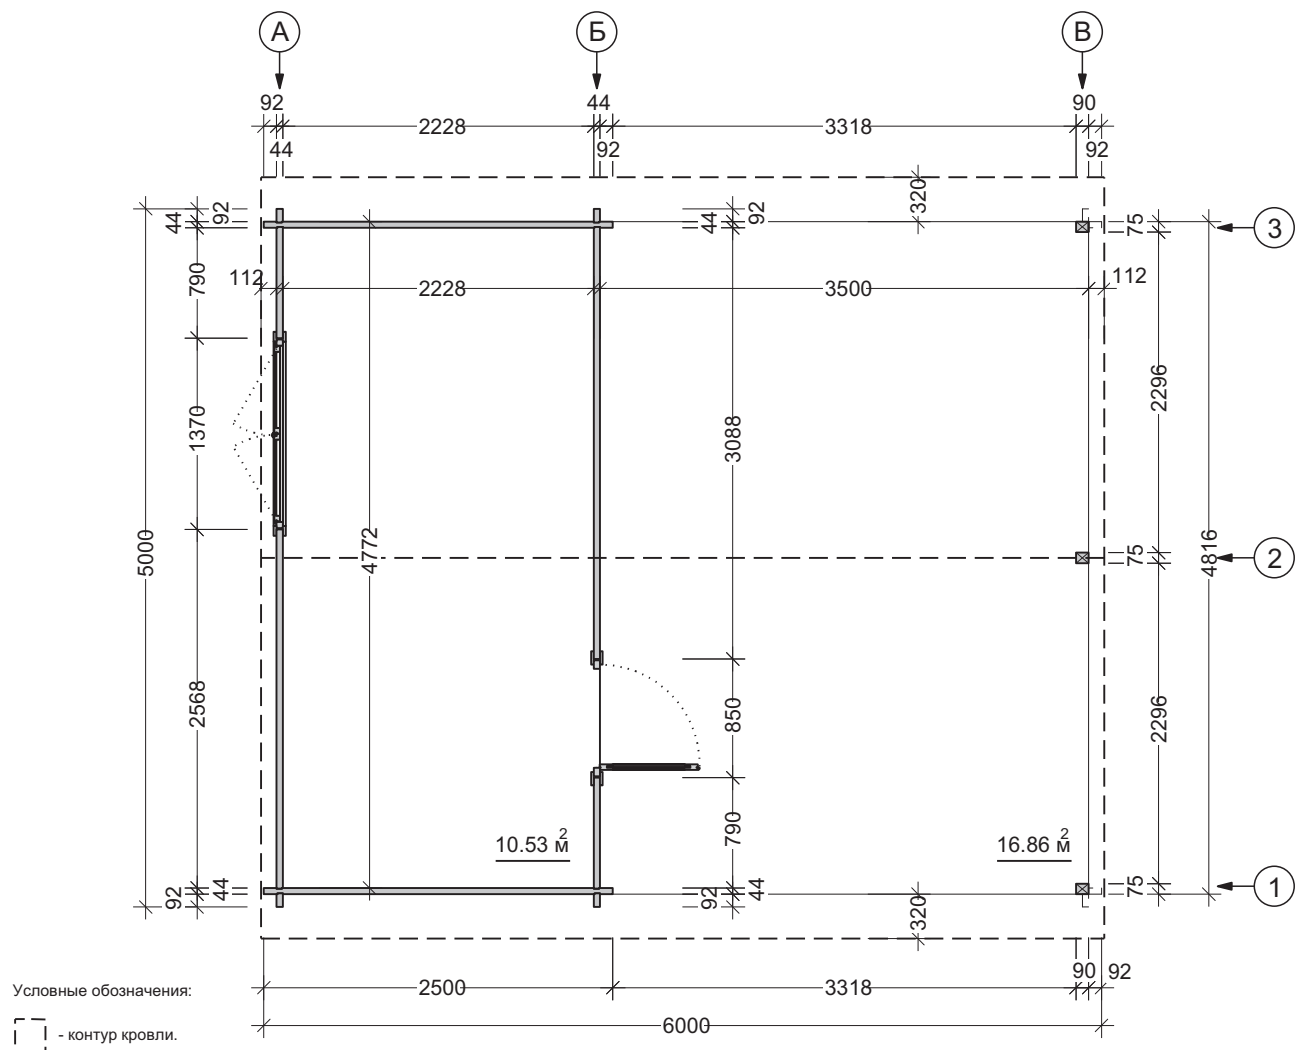

ФУНДАМЕНТ

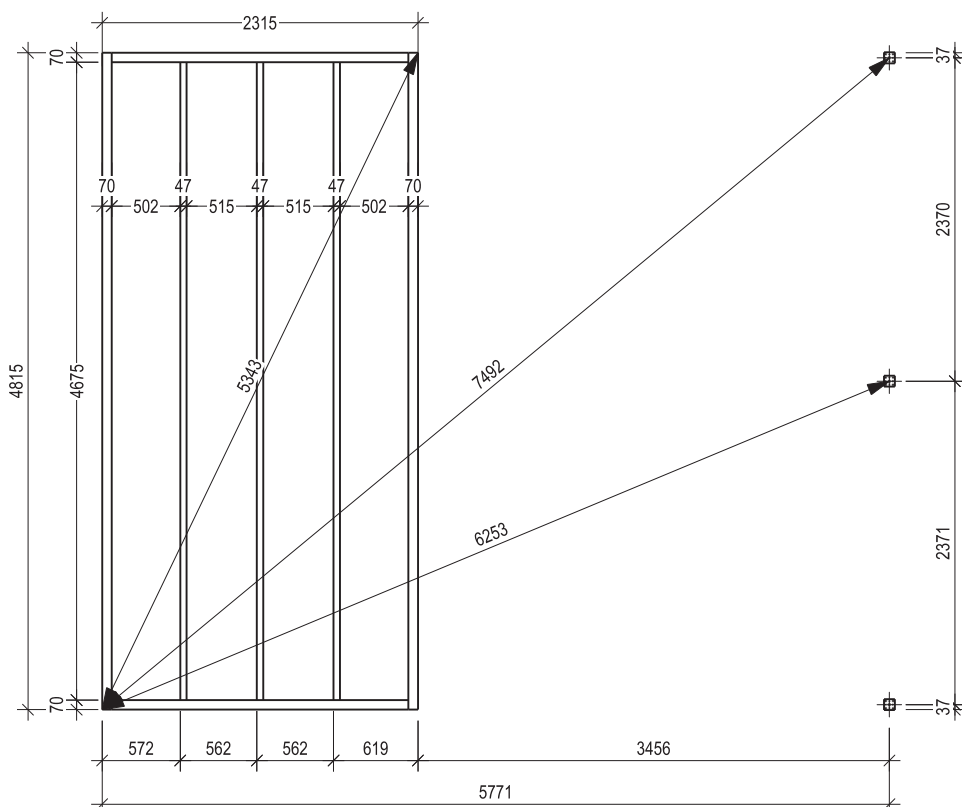


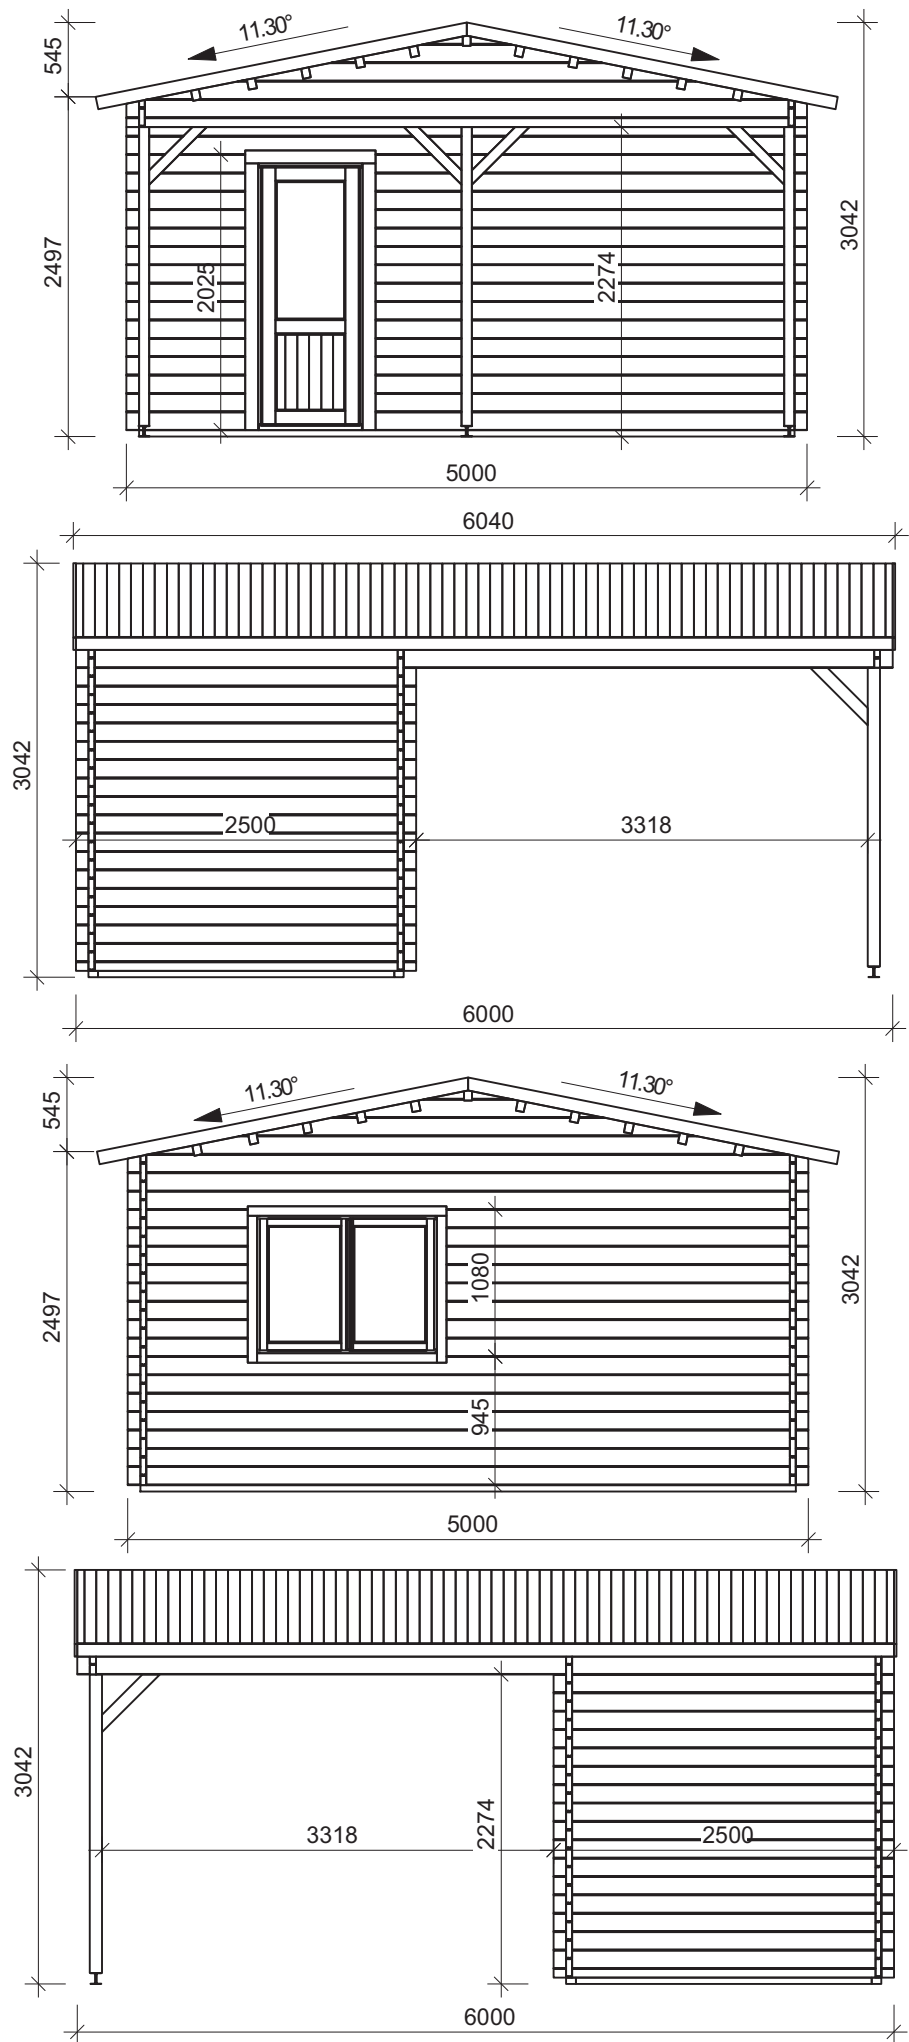


ЭТАПЫ СБОРКИ

1. Сборка каркаса пола

Перед укладкой подкладочного бруса, лаг пола на фундамент уложить слой отсечной гидроизоляции шириной 100 мм (в комплект поставки не входит). Крепление лаг пола, подкладочного бруса к фундаменту выполнять с шагом 1-1,2 м (крепежные изделия в комплект поставки не входят). Крепление каждой регулируемой опоры к основанию должно производиться в 4-х точка (крепежные изделия в комплект поставки не входят).

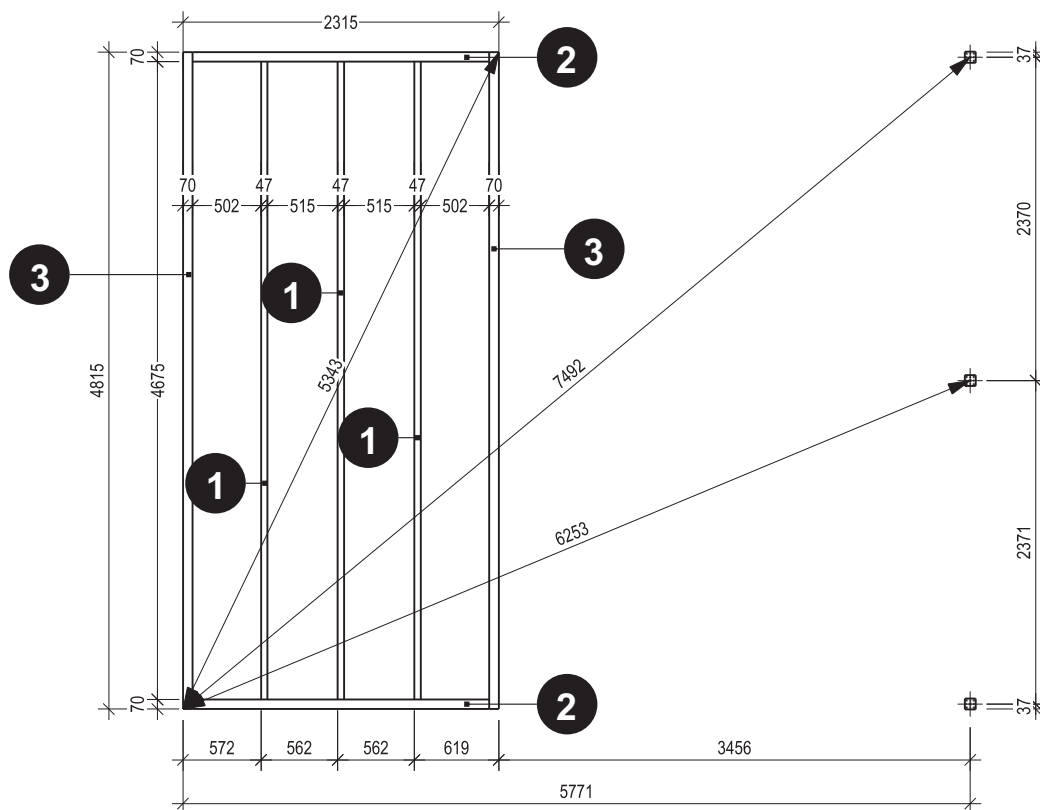


Угловое сплачивание лаг и подкладного бруса производить с помощью самореза 6x120 мм. Предварительно просверлить отверстие диаметром 5 мм на глубину, равную гладкой (без резьбы) части стержня самореза.

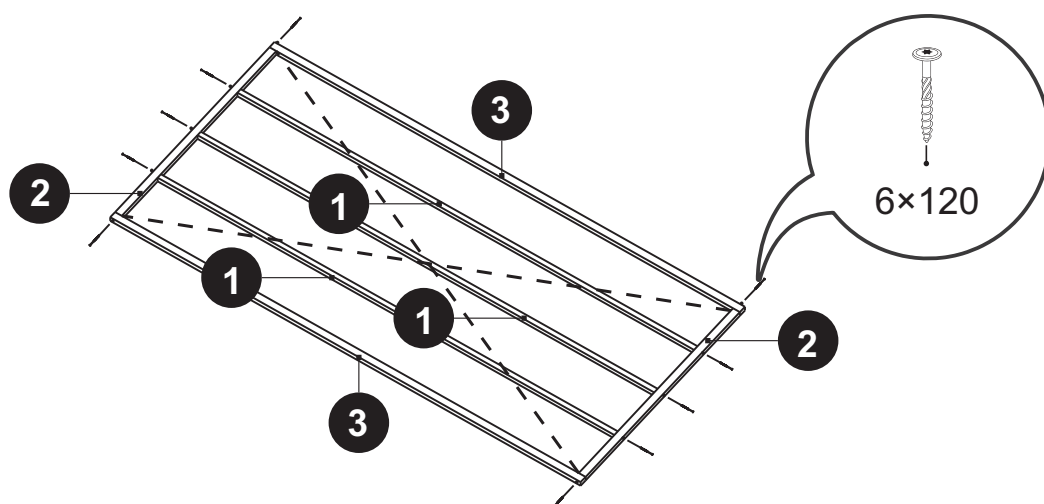

Проверить диагонали каркаса пола.

2. Монтаж первого венца стенового бруса



Элементы **12** крепить с помощью самореза 6x200 мм, элементы **4** — с помощью самореза 6x120 мм. Предварительно просверлить отверстие диаметром 5 мм на глубину, равную гладкой (без резьбы) части стержня самореза. При вкручивании утопить головку самореза в брус на глубину не менее 5 мм. Два самореза ставим по краям детали на расстоянии 250 мм от переруба. Далее с шагом не более 1 м.

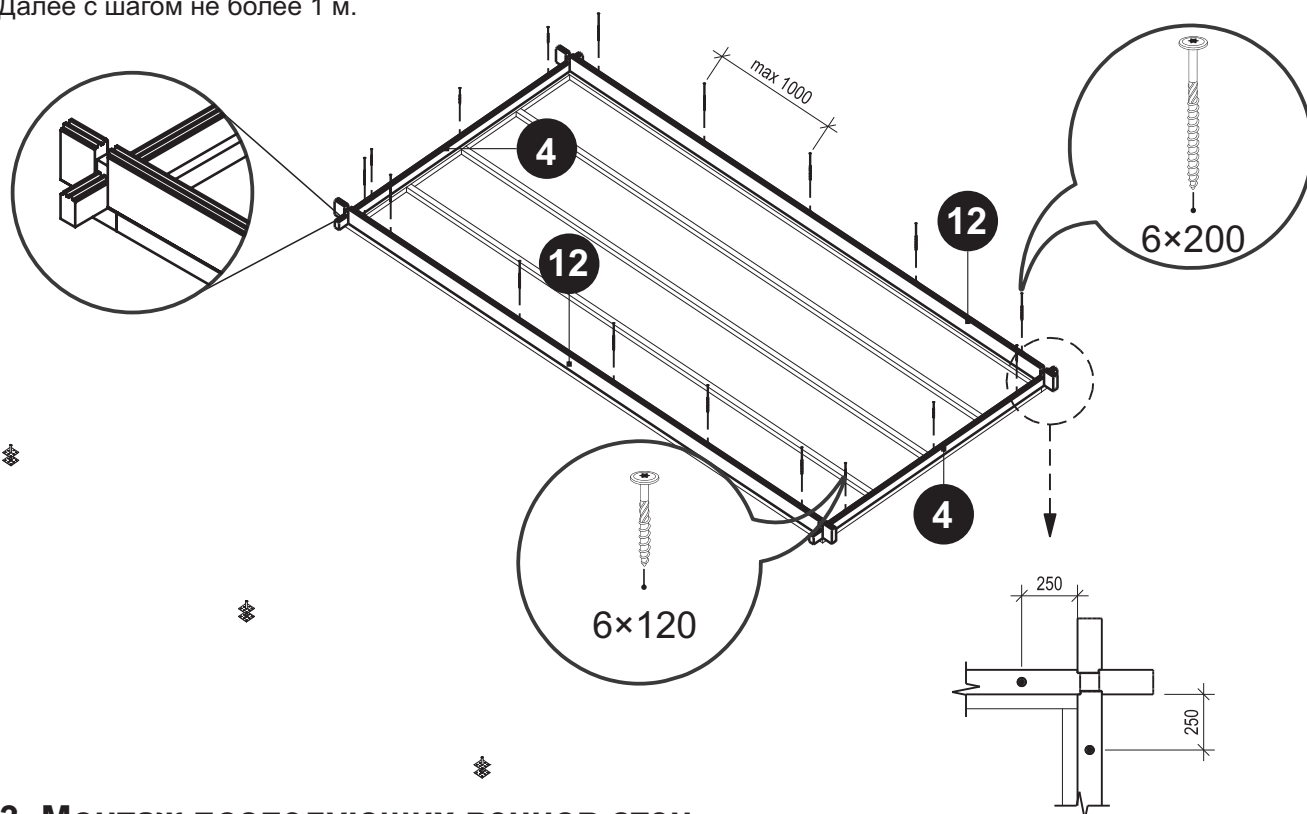


3. Монтаж последующих венцов стен

Каждый ряд (венец) стен строения, начиная со второго, закрепляется саморезами Ø 6x200 мм. По этой схеме собираем 6 однотипных венцов.


Схема сплачивания бруса

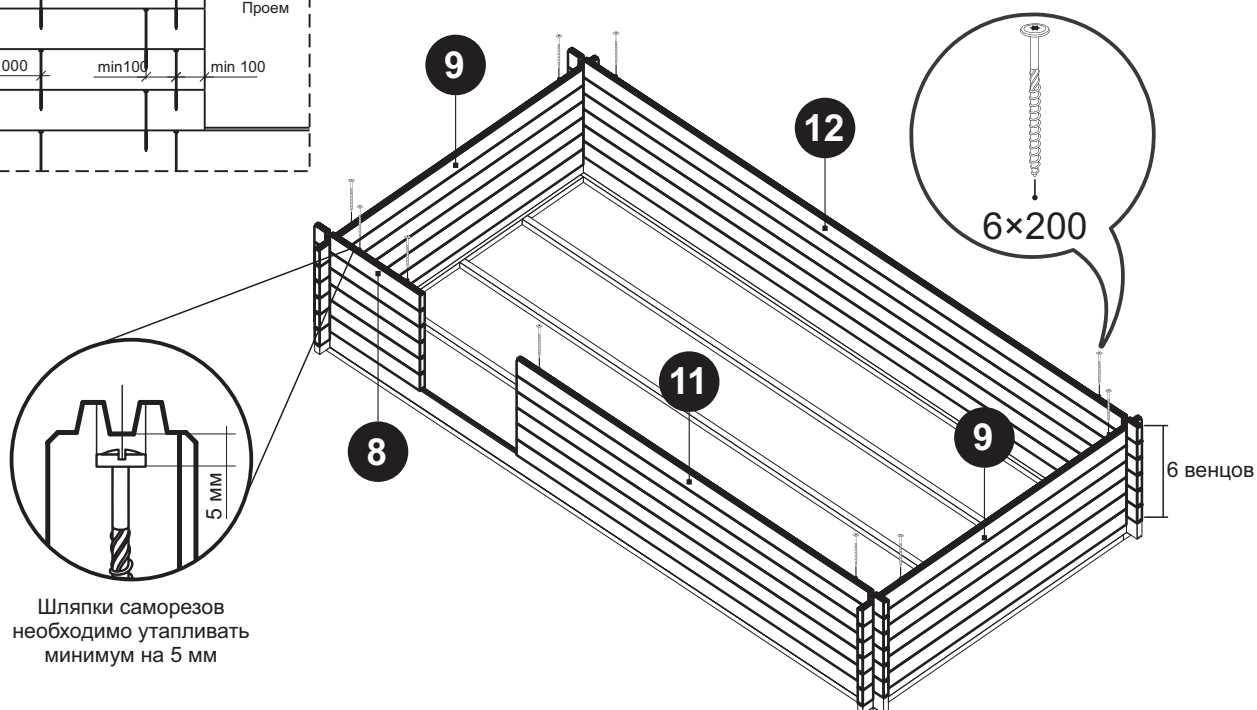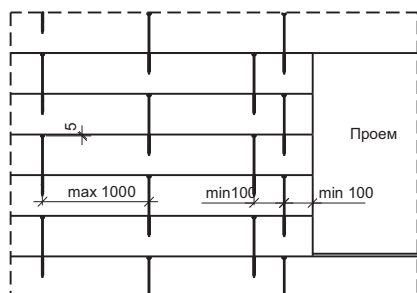


4. Формирование оконных и дверных проемов

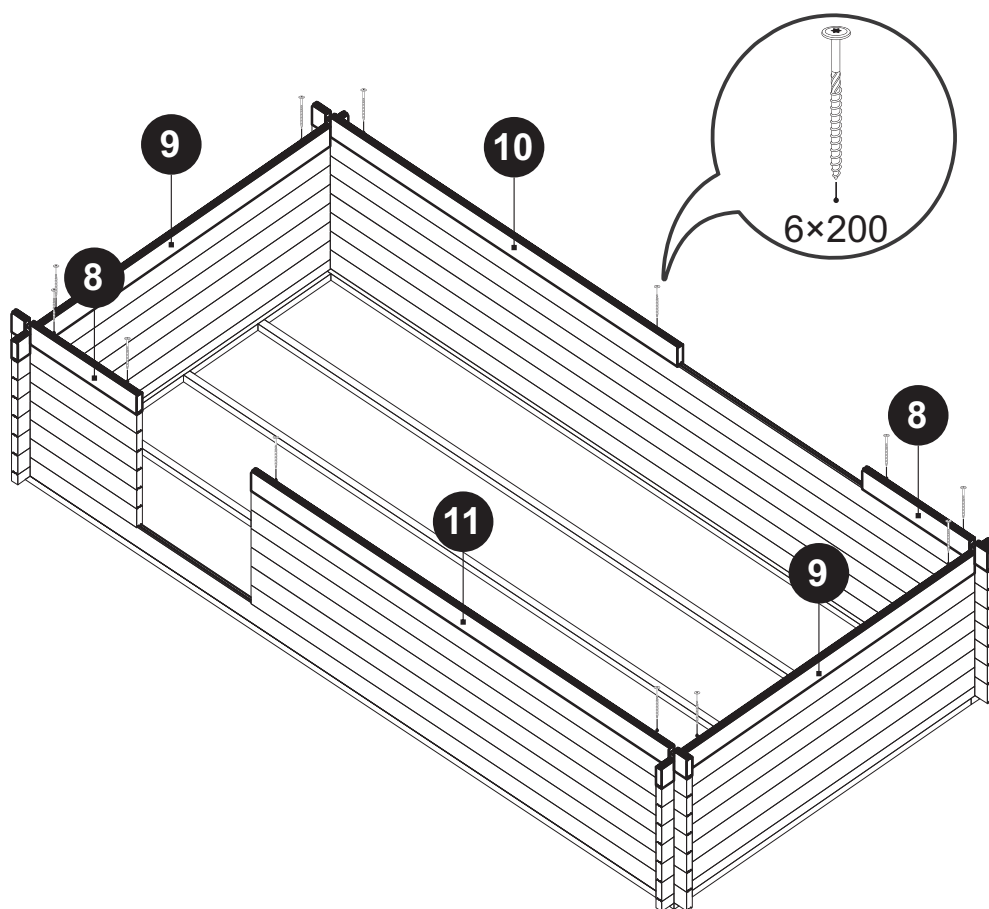


5.

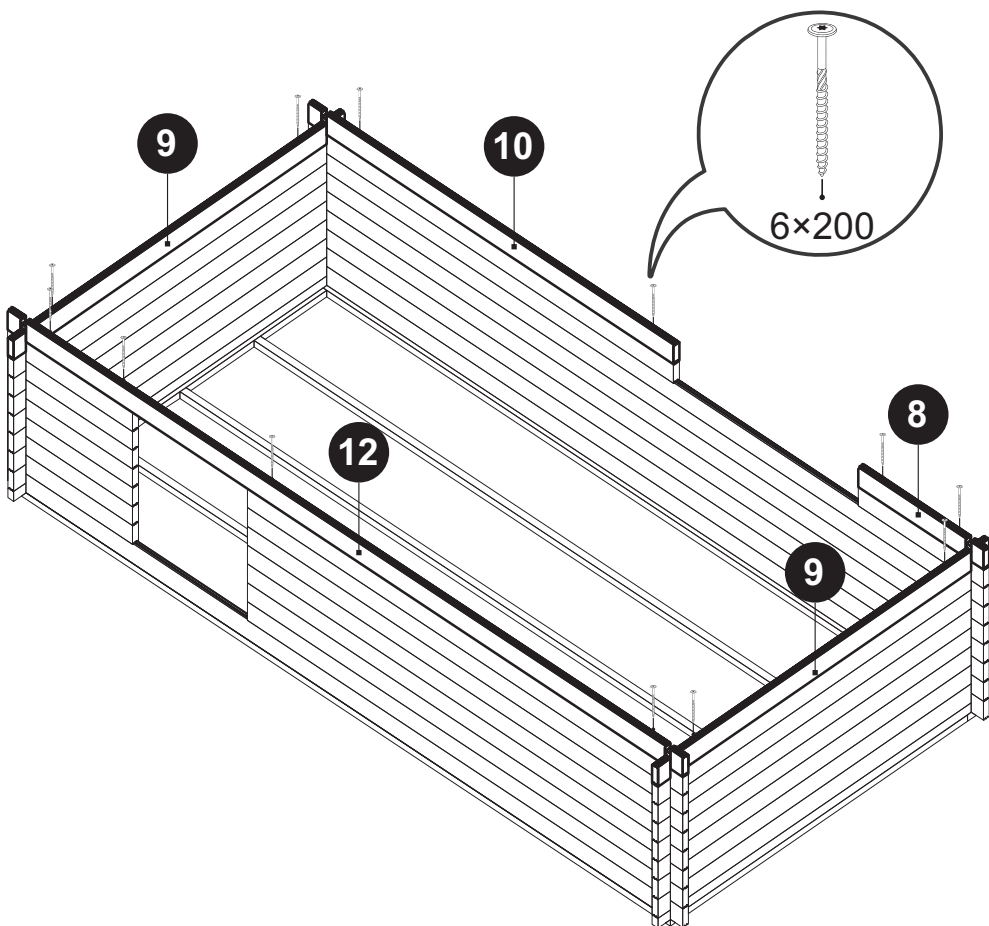

6. По этой схеме собираем 2 однотипных венца.

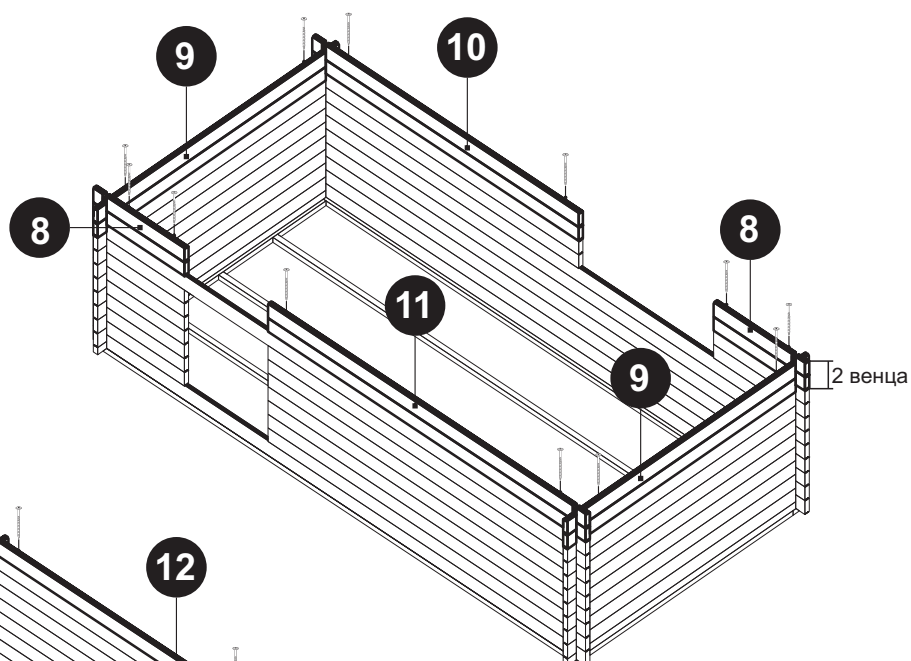


7.

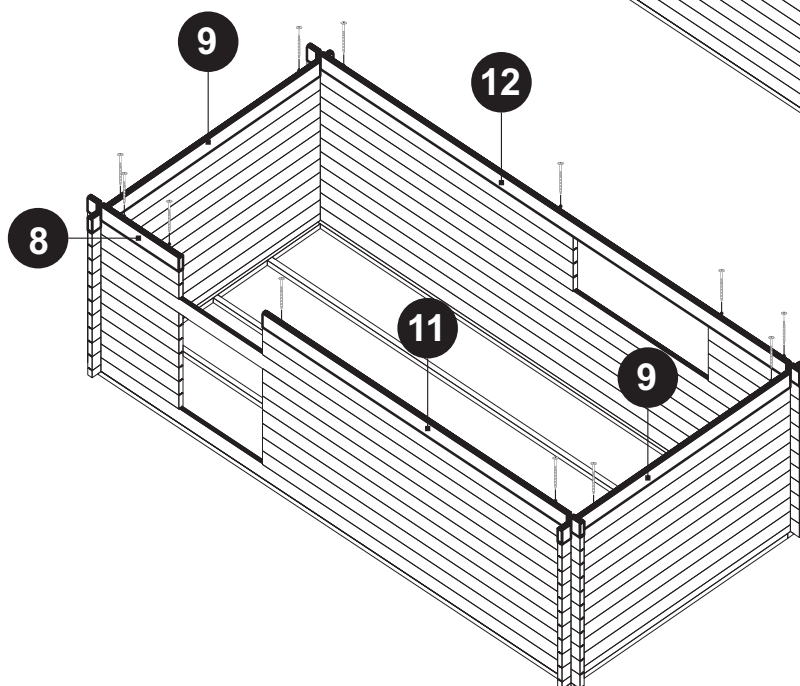


8.

По этой схеме собираем 3 однотипных венца.

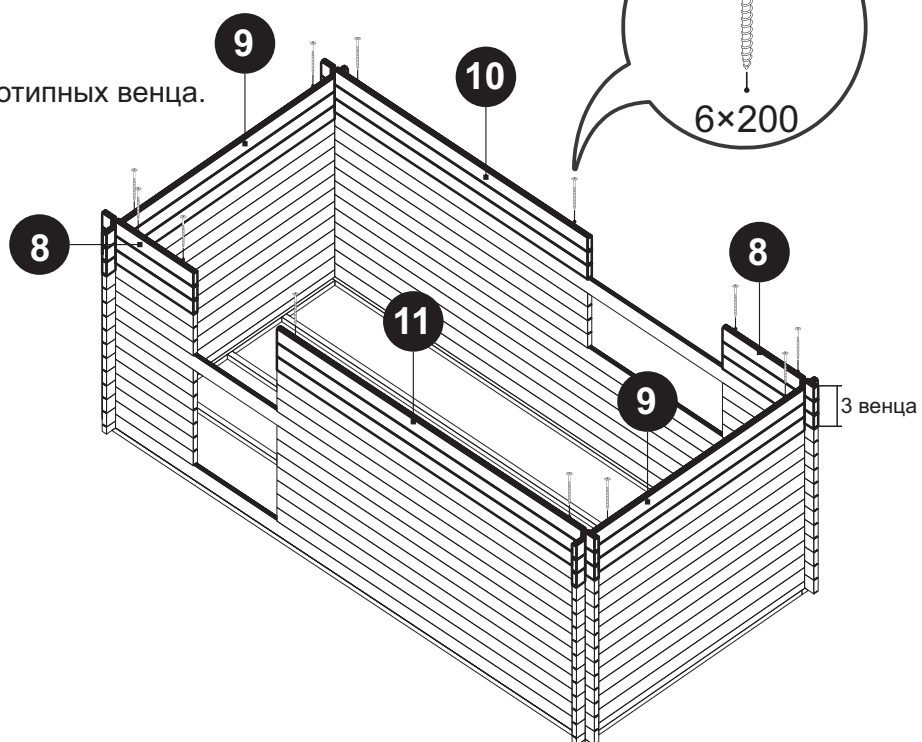


9. Монтаж стоек


Перед установкой опоры необходимо подрезать стойки до требуемой длины. В торце стойки просверлить отверстие диаметром минимум на 2 мм большее, чем диаметр шпильки опоры.

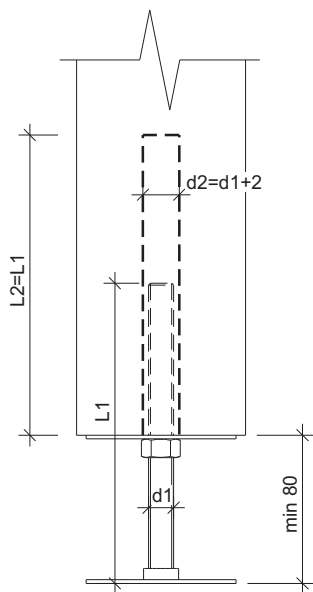



Крепление опоры к стойке производить с помощью самореза 5x70 мм (4 шт). К фундаменту - в четырех точках (крепежные изделия в комплект поставки не входят)



Чтобы избежать образования зазоров между венцами стен необходимо в процессе эксплуатации выполнять регулировку опоры путём подкручивания гайки.




10. Установка стоек

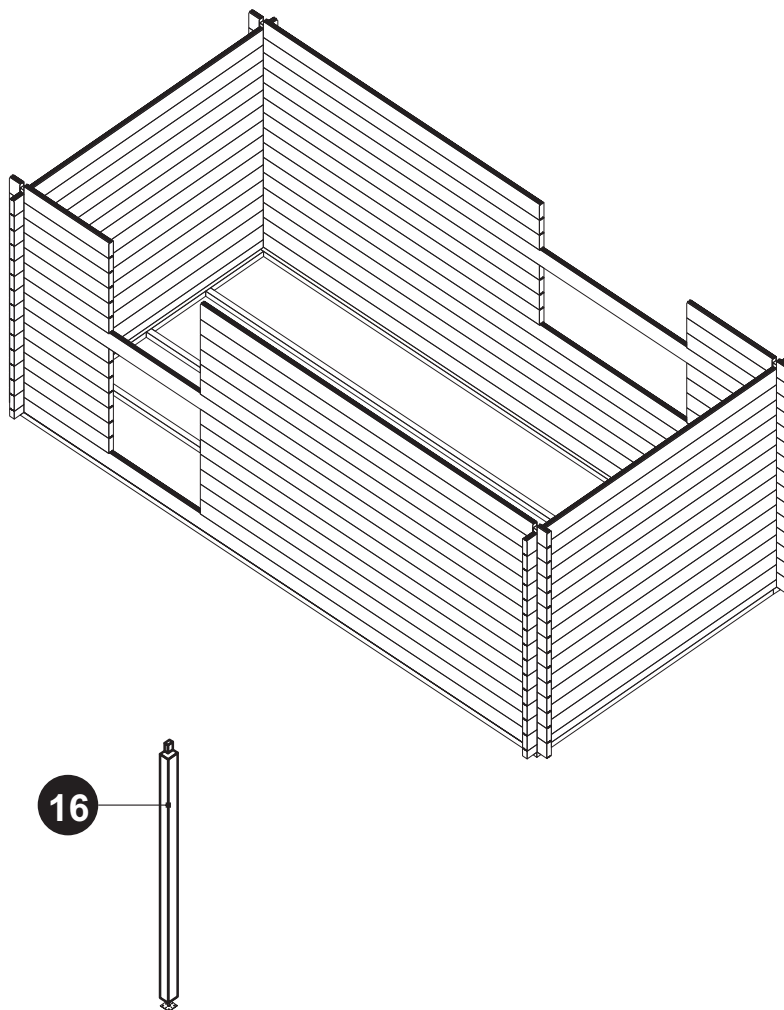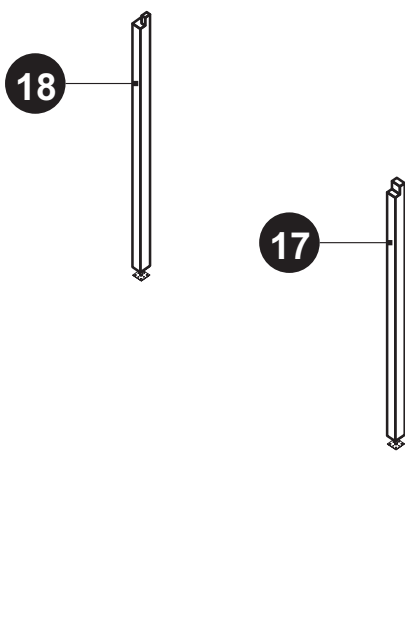


11. Монтаж венцов стенового бруса выше стойки

По этой схеме собираем 2 однотипных венца.

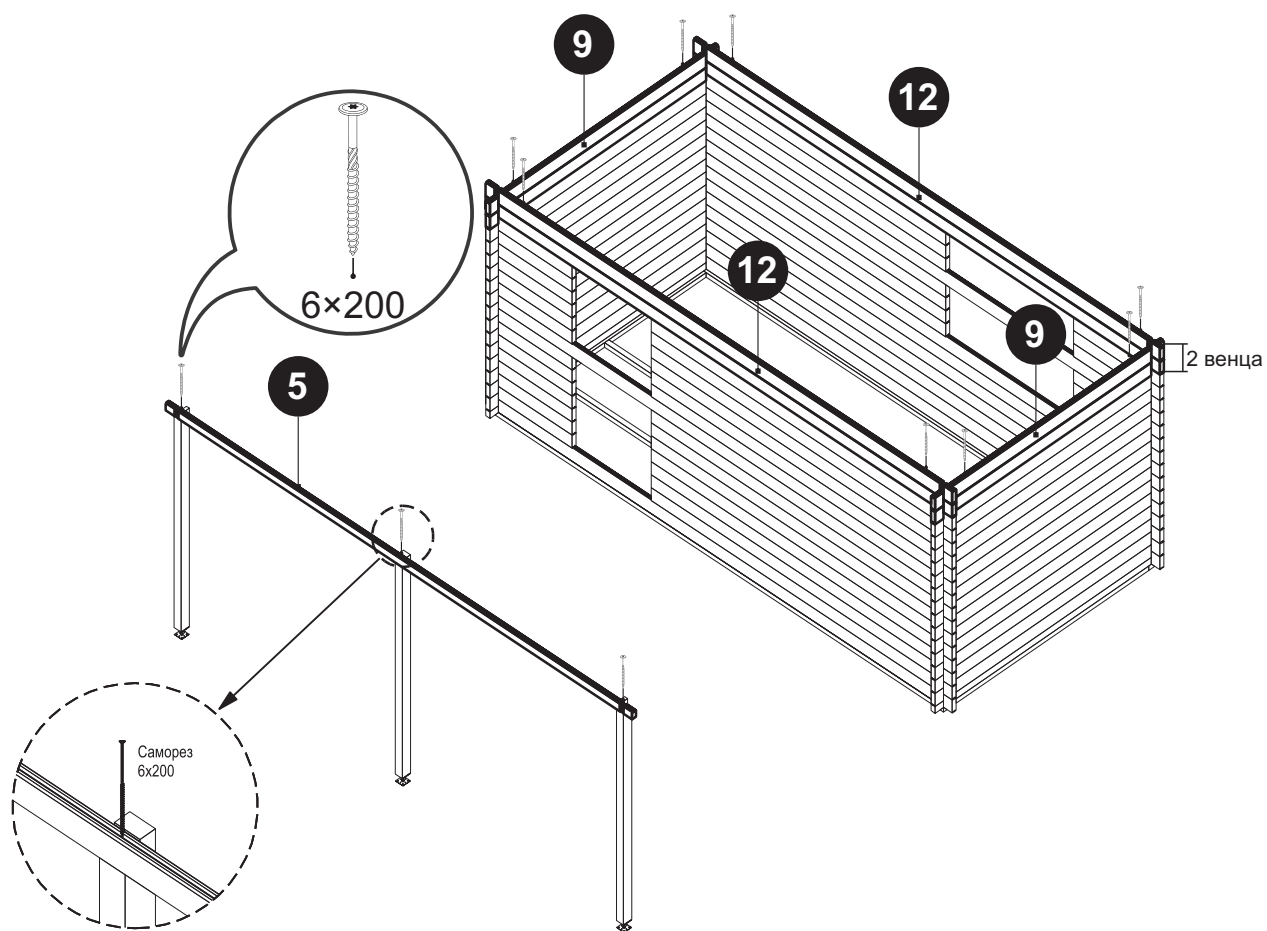


12.

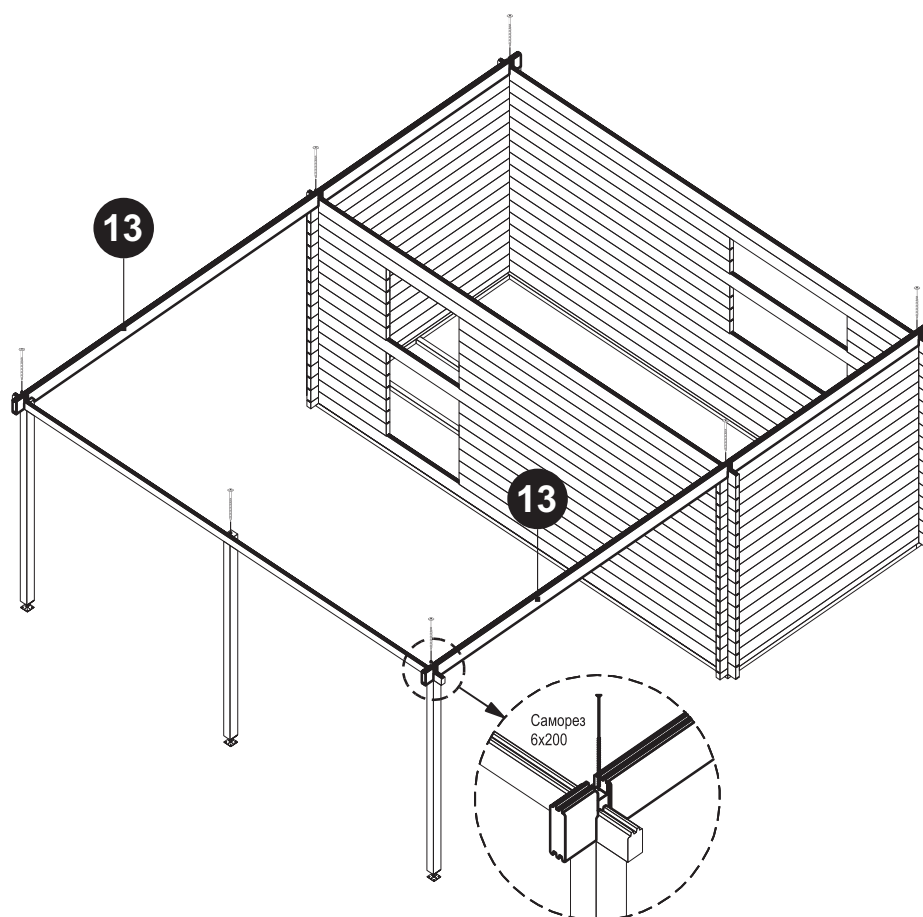


13. Монтаж фронтонов


Фронтоны крепить в крайних точках с помощью саморезов 6х200 мм. Предварительно просверлить отверстие диаметром 5 мм на глубину, равную гладкой (без резьбы) части стержня самореза. При вкручивании утопить головку самореза в брус на глубину не менее 5 мм.

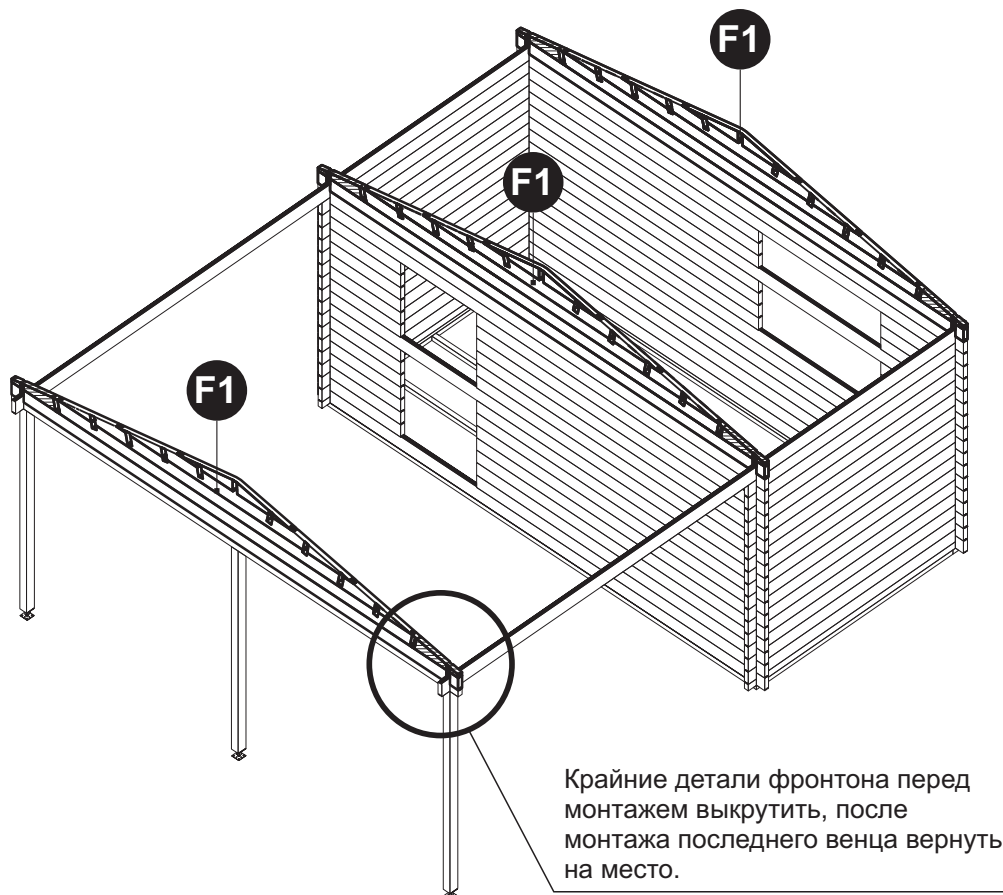

14. Монтаж последнего венца стенового бруса

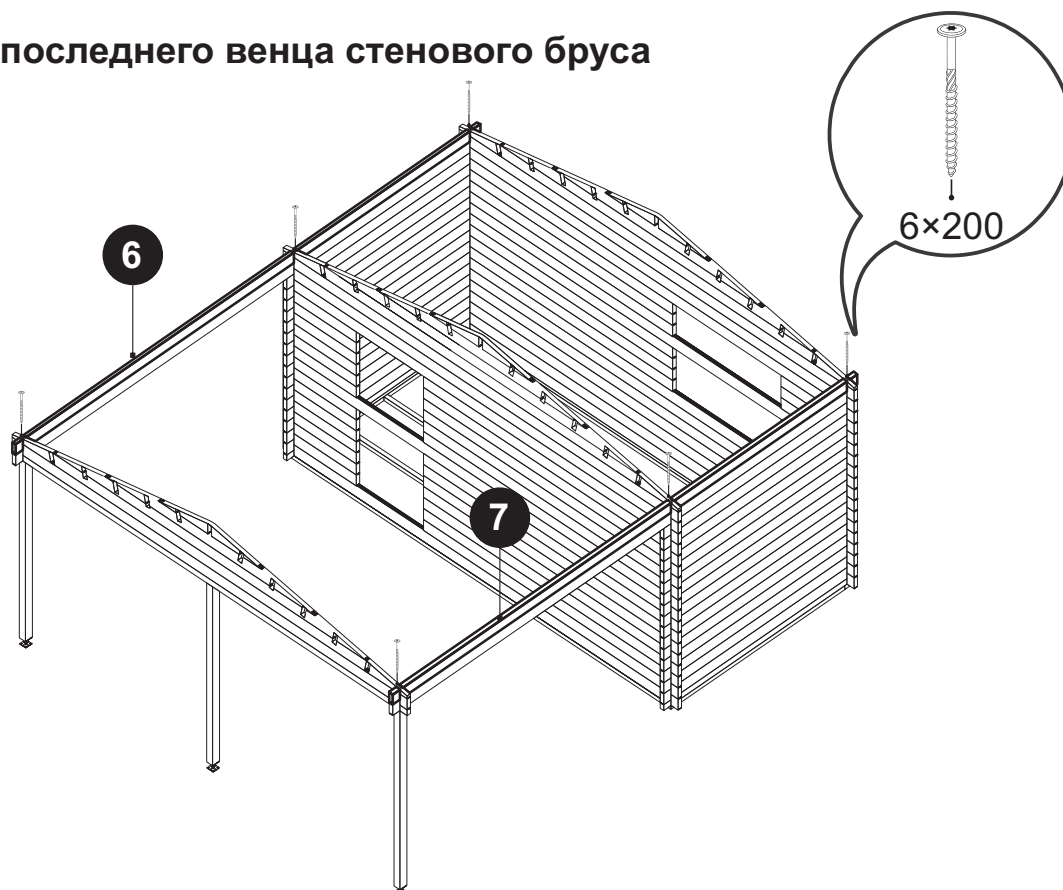


15. Монтаж раскосов

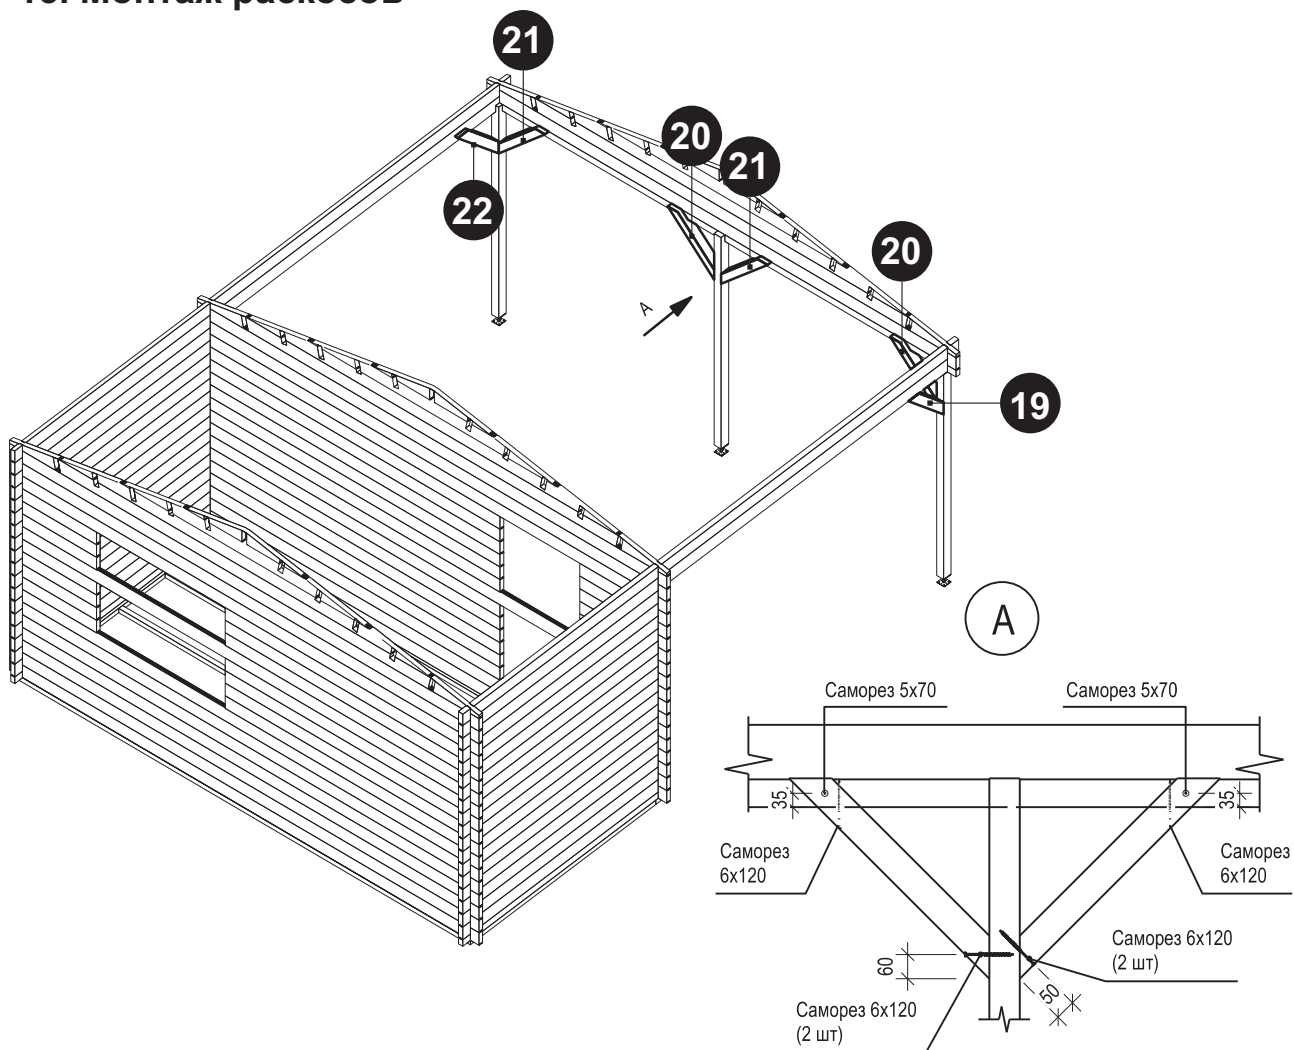

16. Монтаж прогонов

Прогоны крепить в крайних точках с помощью саморезов 6x200 мм. Предварительно просверлить отверстие диаметром 5 мм на глубину, равную гладкой (без резьбы) части стержня самореза.

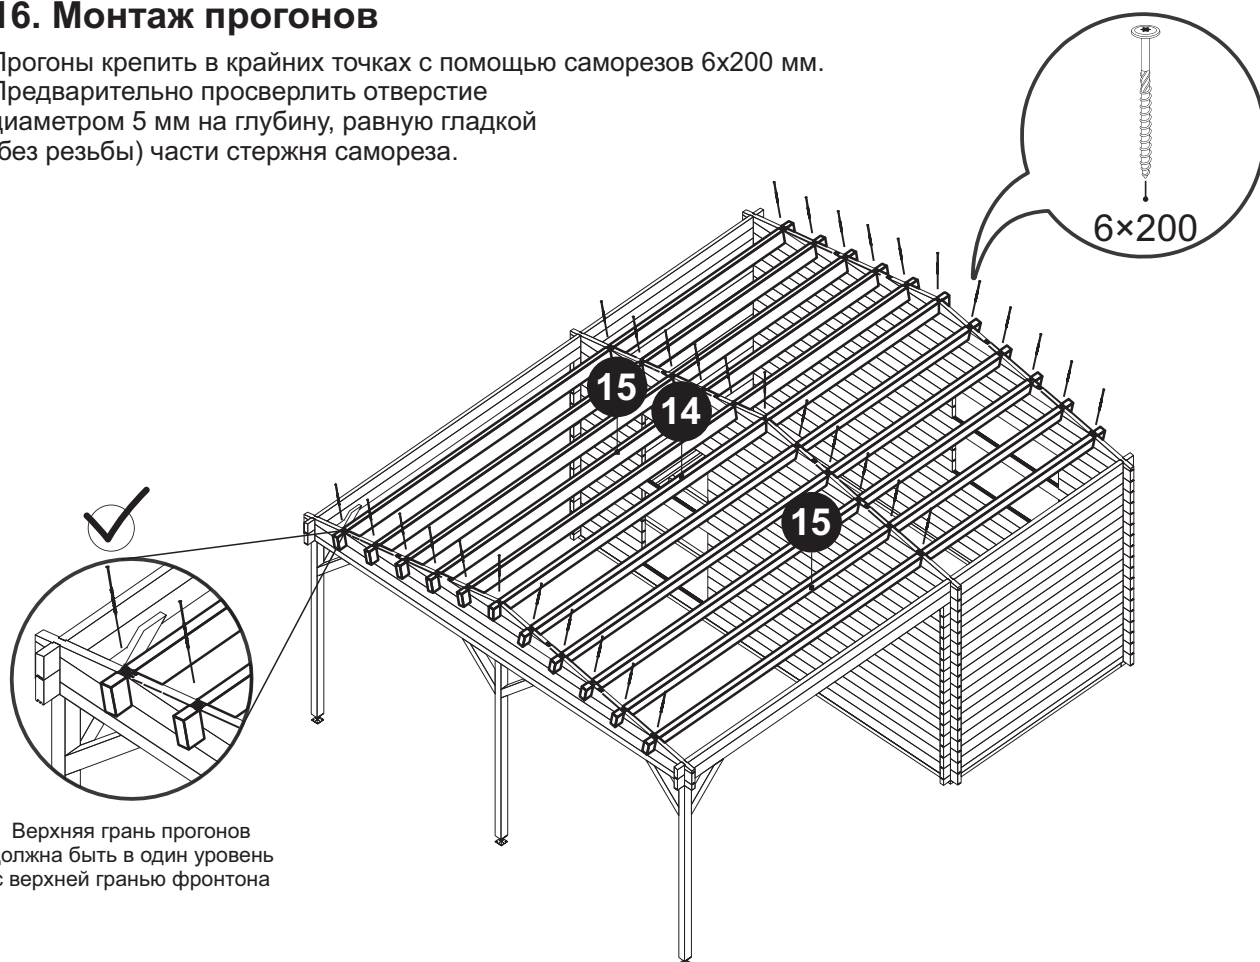


Верхняя грань прогонов должна быть в один уровень с верхней гранью фронтона

17. Монтаж настила по прогонам


Настил раскладывать лицевой стороной внутрь помещения.

Крепление производить с помощью гвоздя ершеного 2,5х60 мм ((2 шт. в местах опирания на прогоны и стены). Крайние доски продольно обрезать по месту.

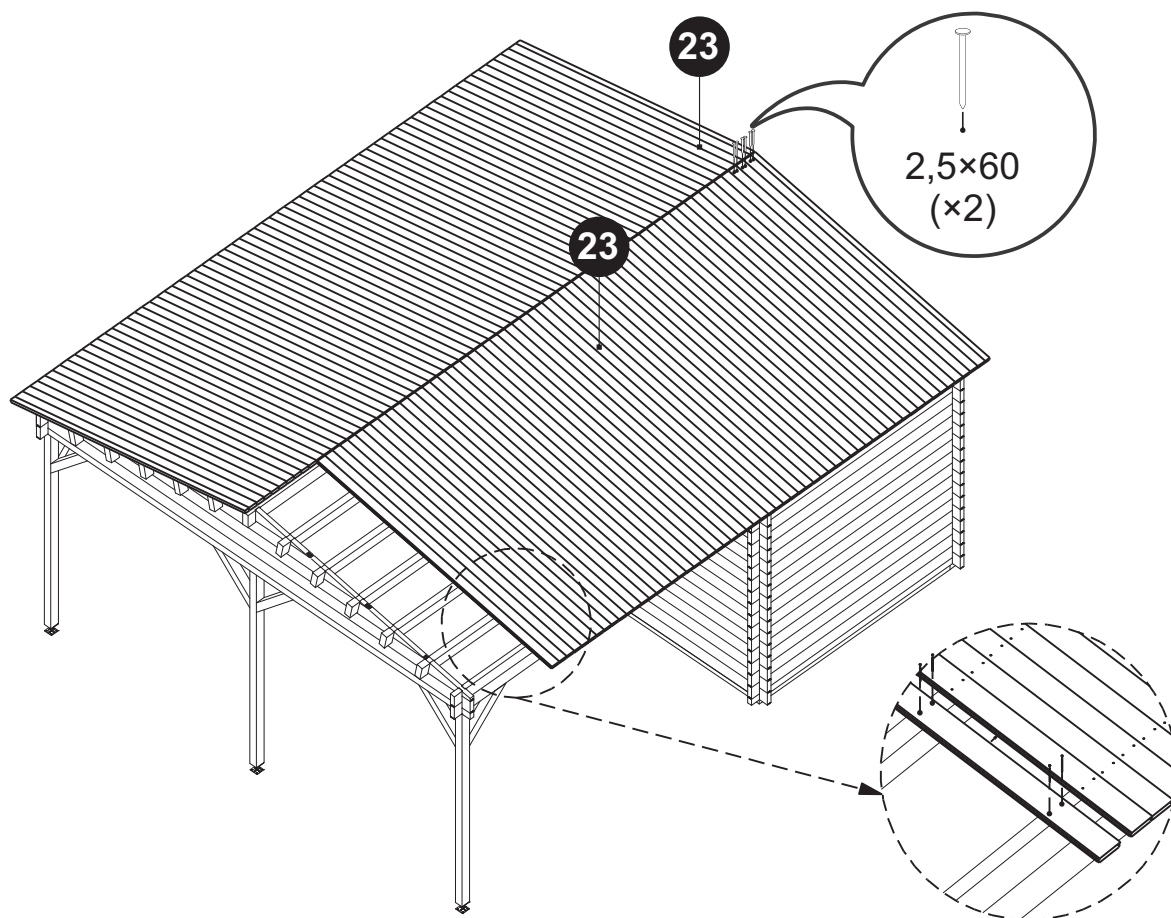


18. Оформление карнизов

Подрезку под угол кровли торцевых лобовых досок 25 выполнить по месту.

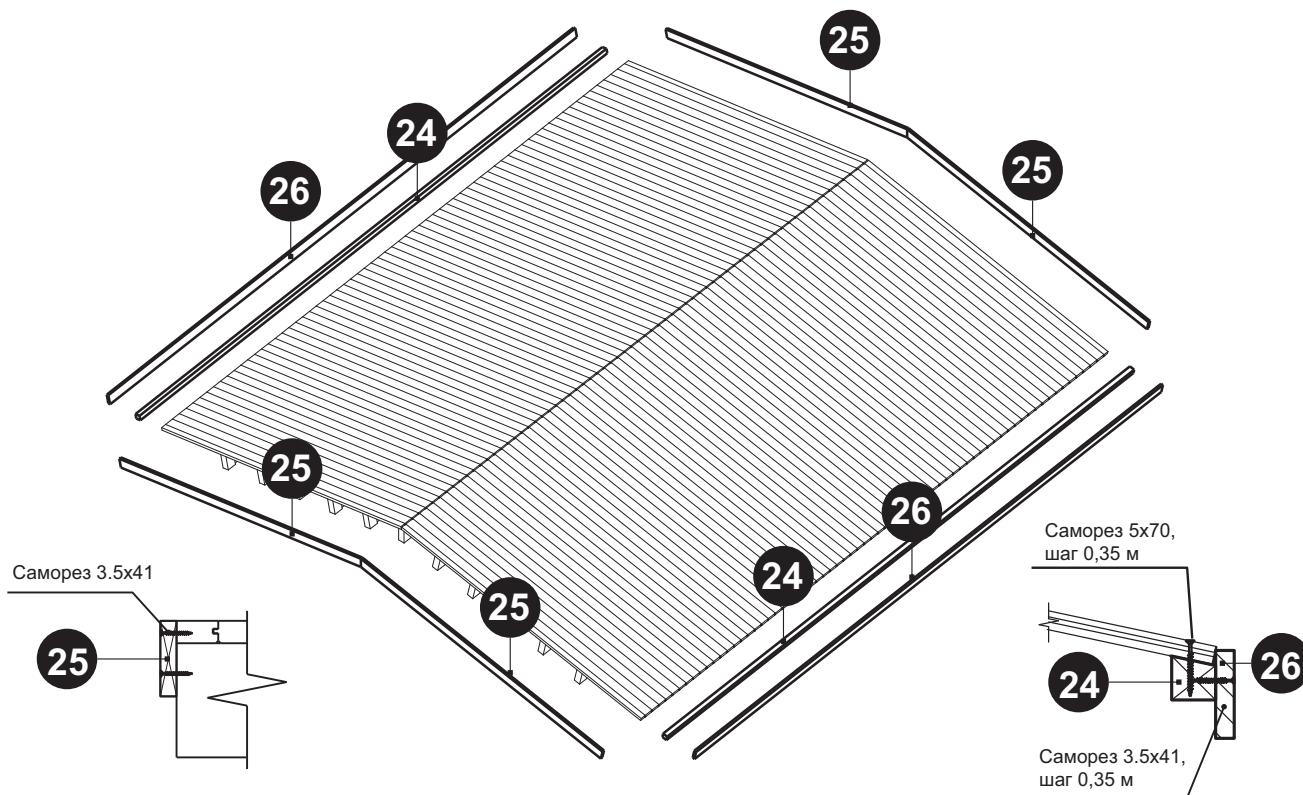

19. Демонтаж монтажных перемычек


Монтажные перемычки в проемах вырезать.

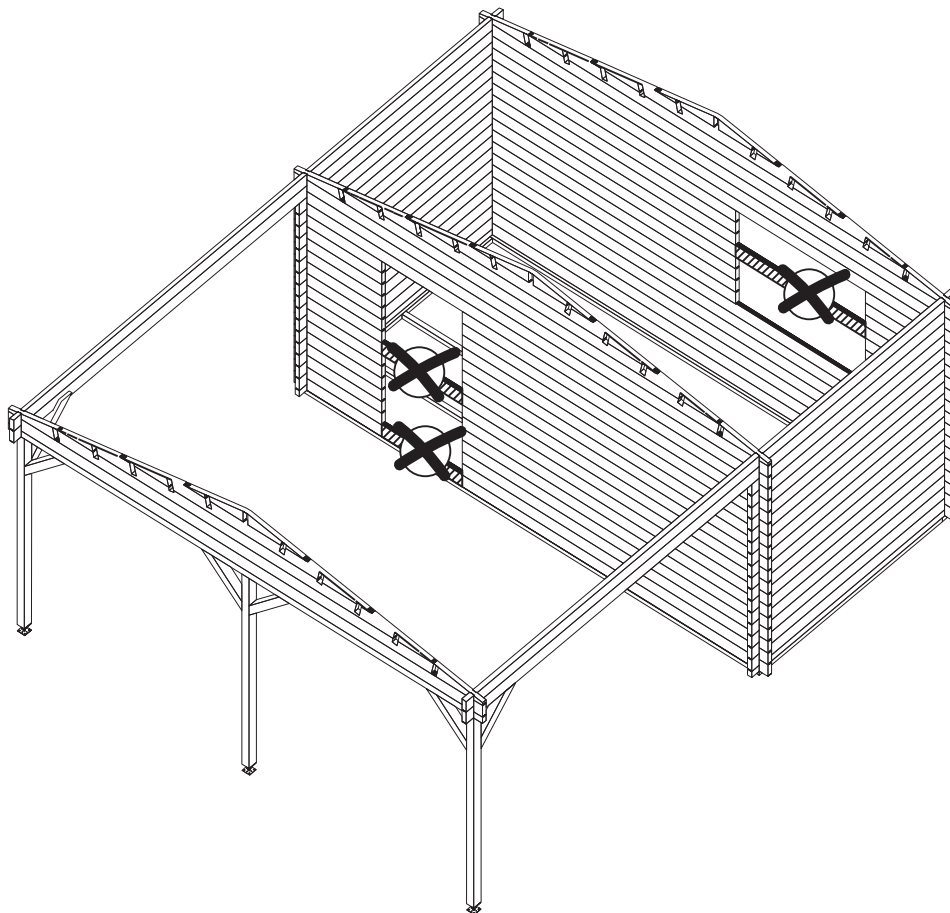

20. Крепление настила пола к лагам

При монтаже настила пола соблюдать отступ от стен минимум 5 мм.

Крепить настил пола с помощью гвоздя ершенного 2,5х60 мм (2 шт. на место опирания).

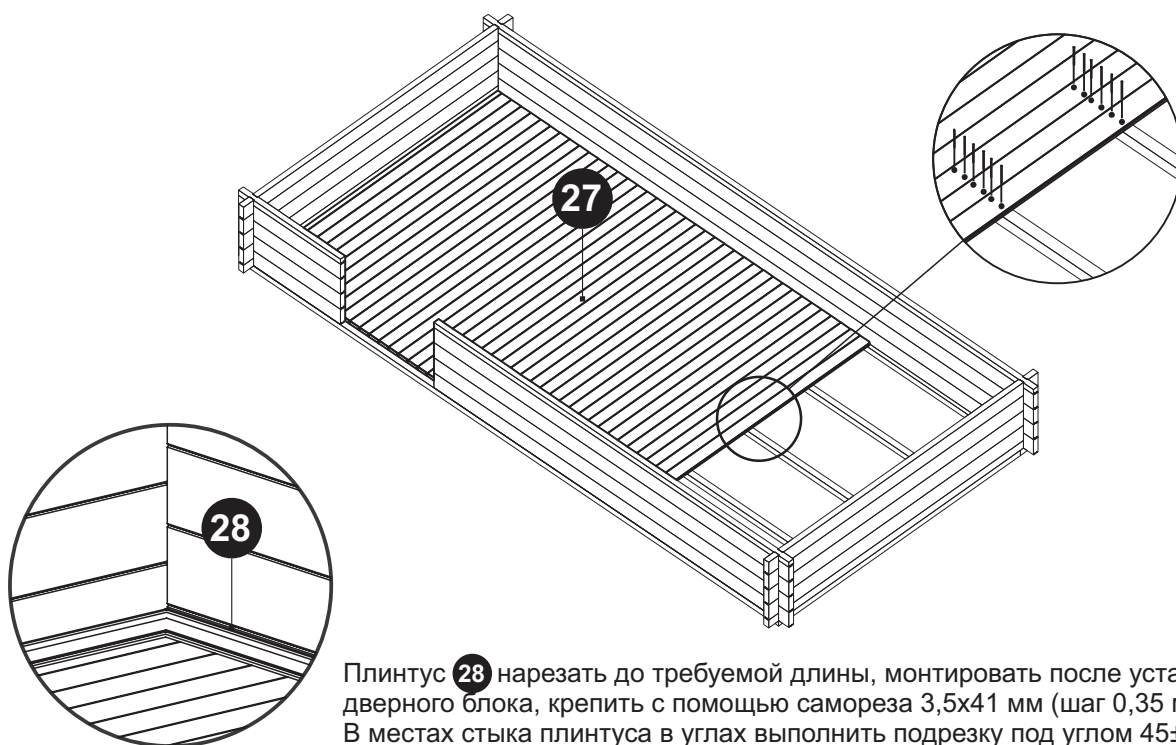


Плинтус **28** нарезать до требуемой длины, монтировать после установки дверного блока, крепить с помощью самореза 3,5х41 мм (шаг 0,35 м). В местах стыка плинтуса в углах выполнить подрезку под углом $45 \pm 1^\circ$.

21. Установка окон и дверей


Окна и двери вставляются в конце после сборки стен.




Проверьте диагонали коробки дверного проёма.

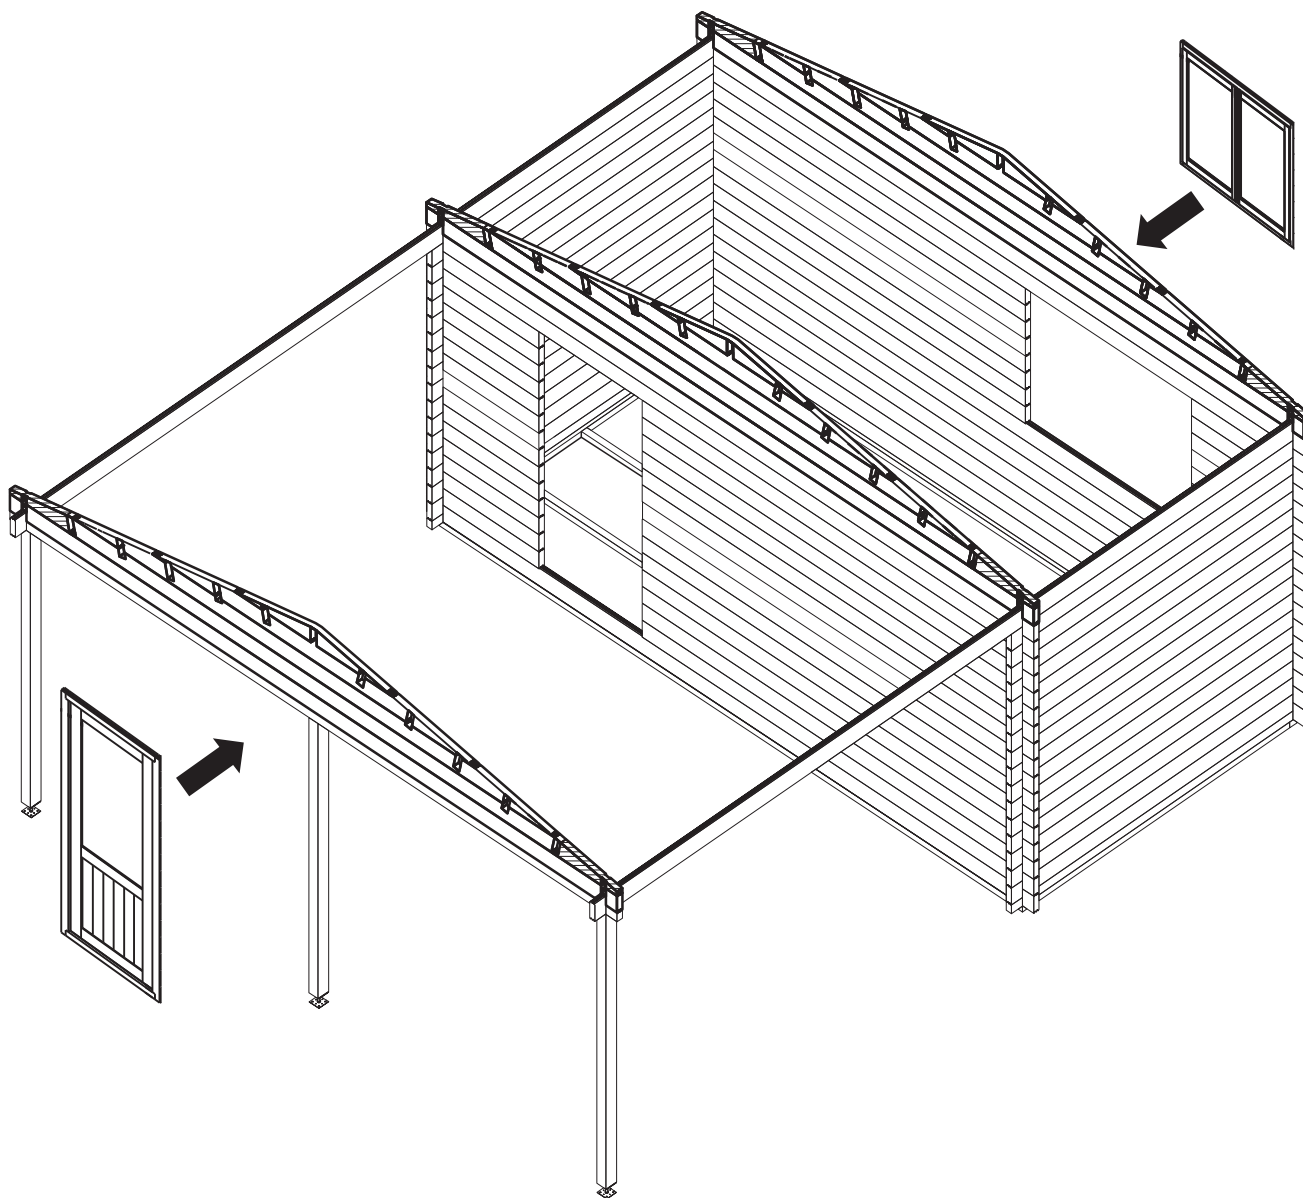

Установка оконного блока WS1

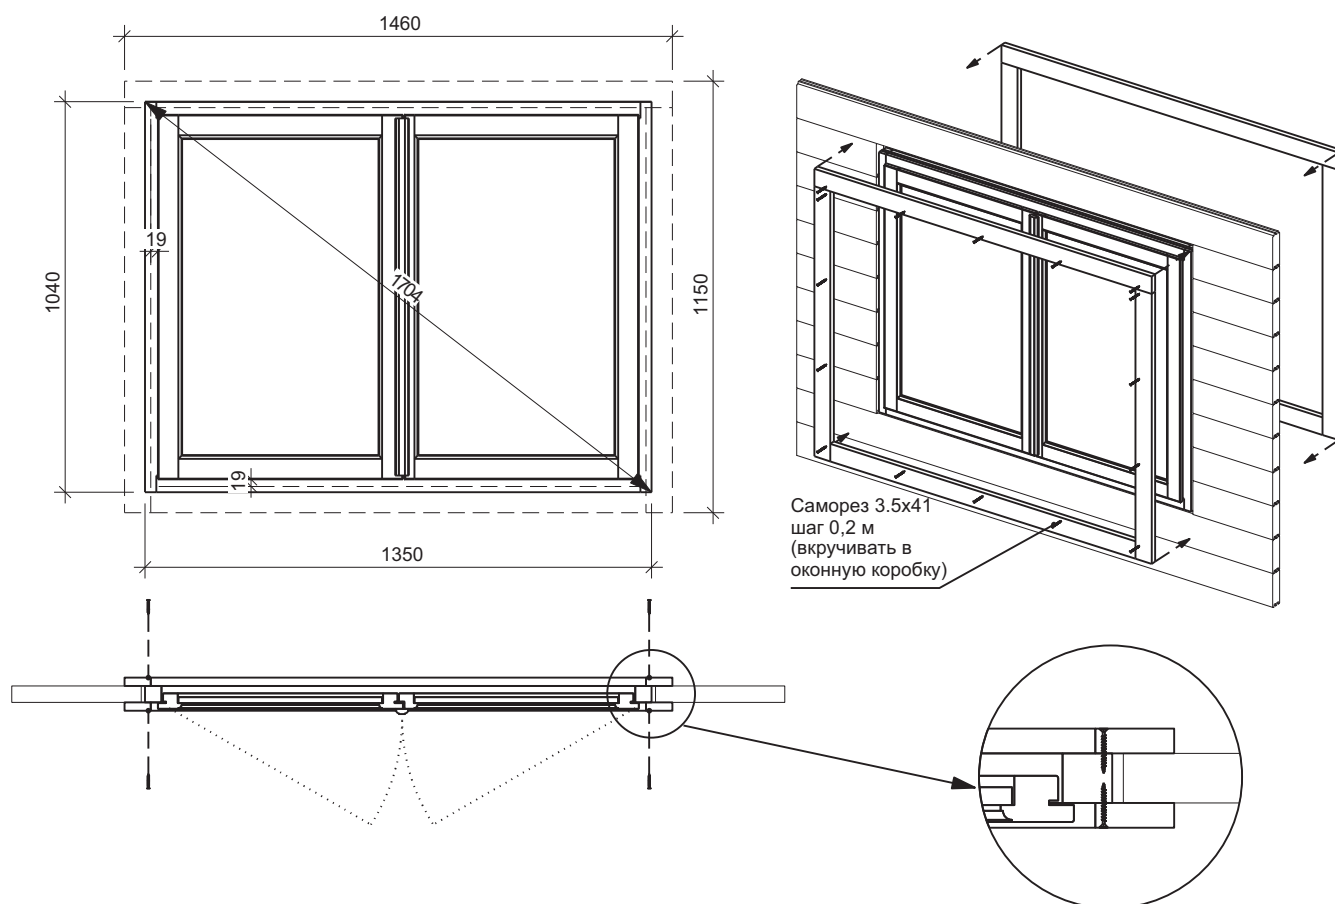

Установка дверного блока D1

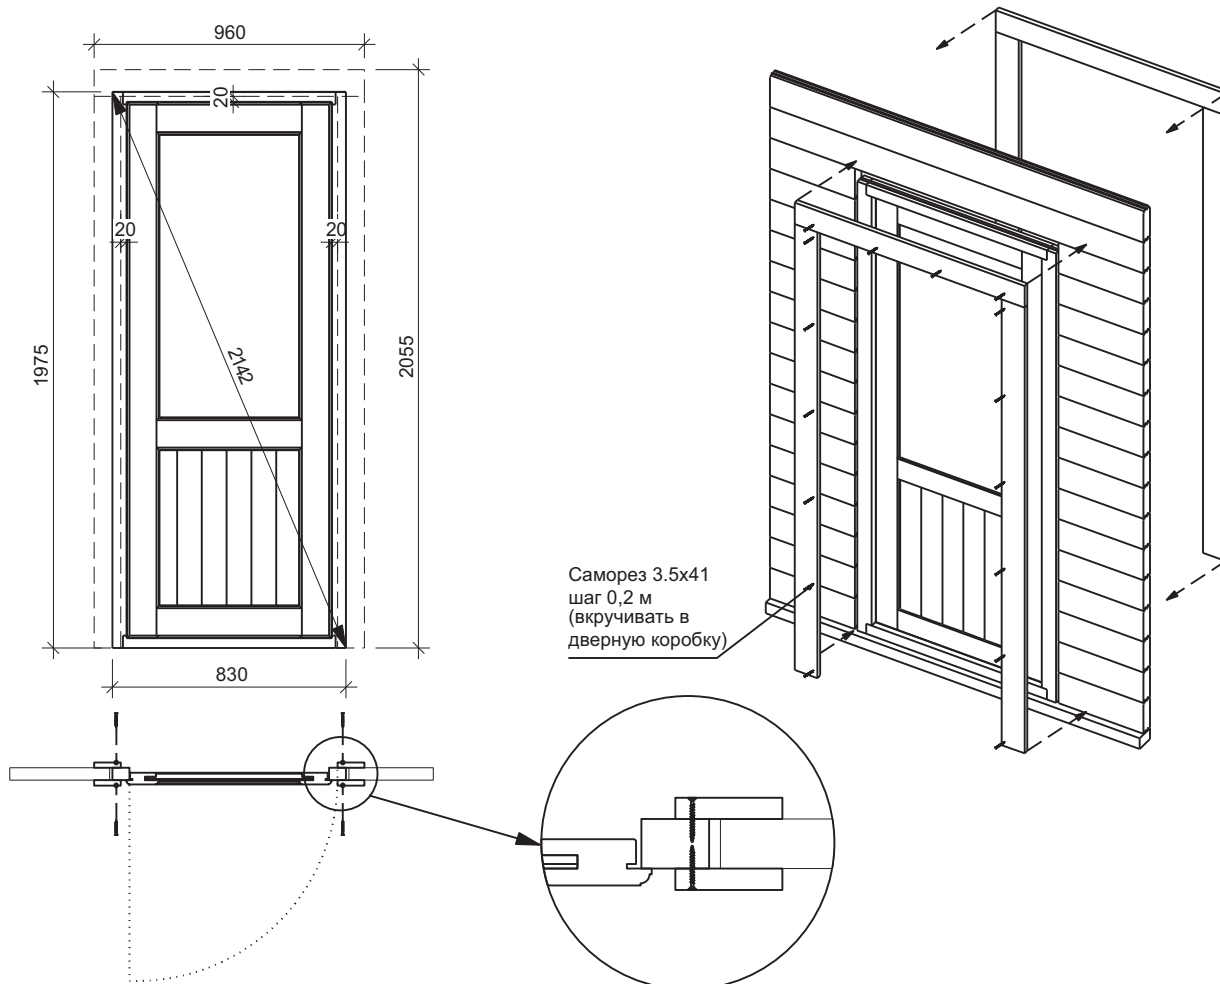

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАБОТКЕ

После полной сборки строения следует устранить длительное или периодическое увлажнение древесины путём её защиты от биоразрушения. Обработайте продукт в течение 7 календарных дней.

Для защиты деревянных стен снаружи строения допускается применять специальные составы на основе натуральных масел и восков, а также плёнкообразующие лакокрасочные покрытия на водной или акриловой основе, которые защищают древесину от увлажнения атмосферными осадками и воздействия УФ-излучения.

Деревянные конструкции строения внутри помещения допускается не обрабатывать защитными составами если относительная влажность воздуха при эксплуатации не превышает 60 %. Если относительная влажность воздуха внутри помещений в процессе эксплуатации превышает 60 %, то рекомендуется выполнить защитную обработку деревянных поверхностей влагозащитными окрасочными составами.



Производитель оставляет за собой право в любое время, без предварительного уведомления, вносить изменения в оборудование, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на качество продукции.

