




ТЕРРАСА ПРЯМАЯ

3

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

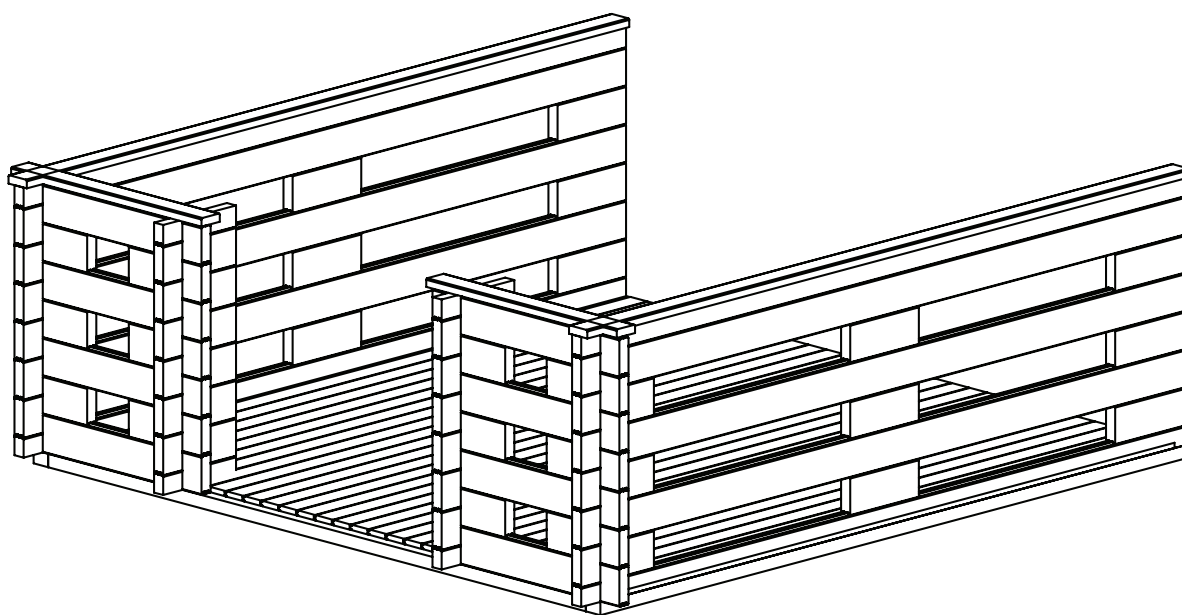

L=3


44 мм

ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СБОРКИ

1. Молоток
2. Пила
3. Киянка
4. Рулетка
5. Перчатки

6. Лестница
7. Шуруповерт
8. Плоскогубцы
9. Уровень


10. Бита крестовая PZ-2
и PZ-3
11. Сверло Ø5 мм, длиной
не менее 180 мм

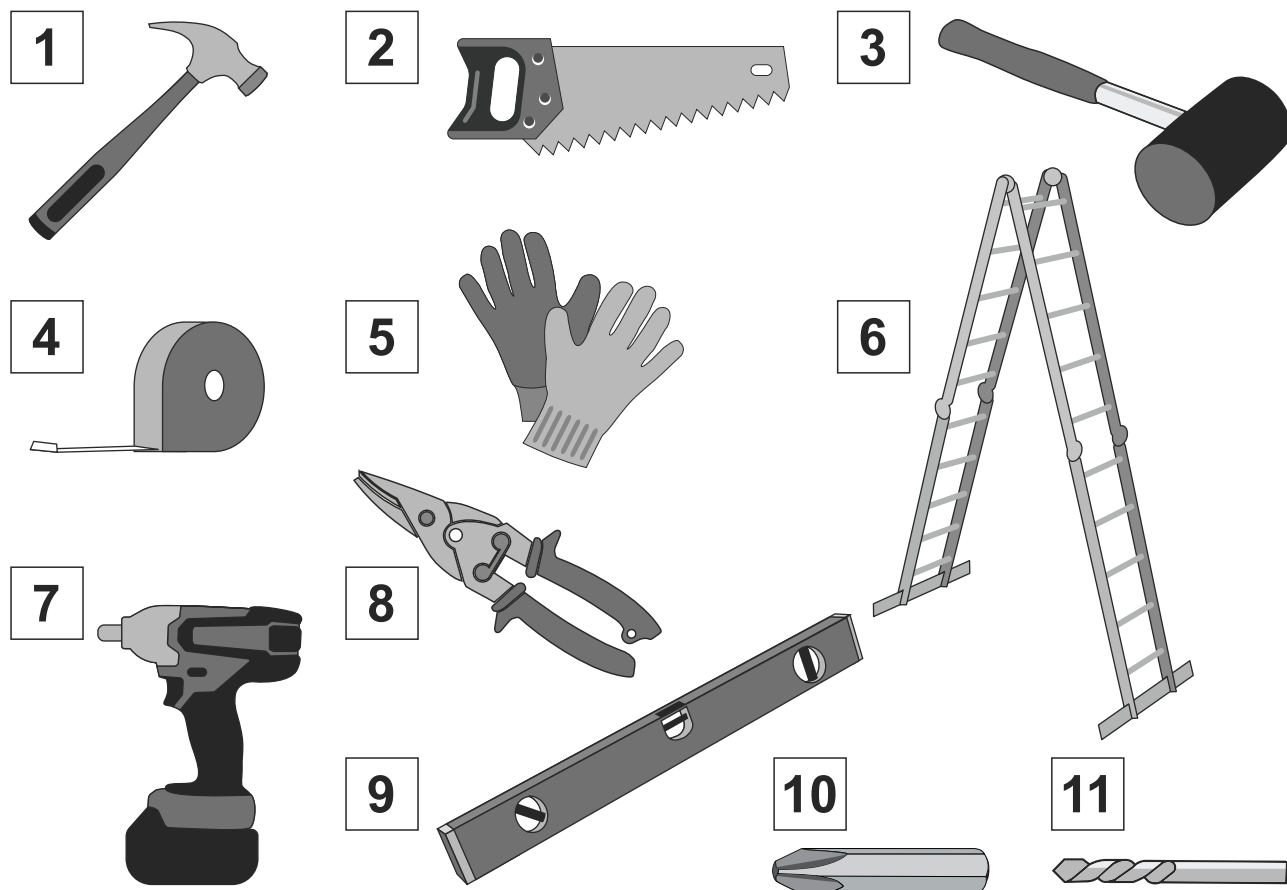


ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ

Терраса произведена согласно СТО 72746455-3.13.2-2025


Конструкция дома позволяет собирать его в левом (входная дверь с левой стороны фасада, окно на правом боковом фасаде) и правом (входная дверь с правой стороны фасада, окно на левом боковом фасаде) исполнениях, что отражено в данной инструкции.

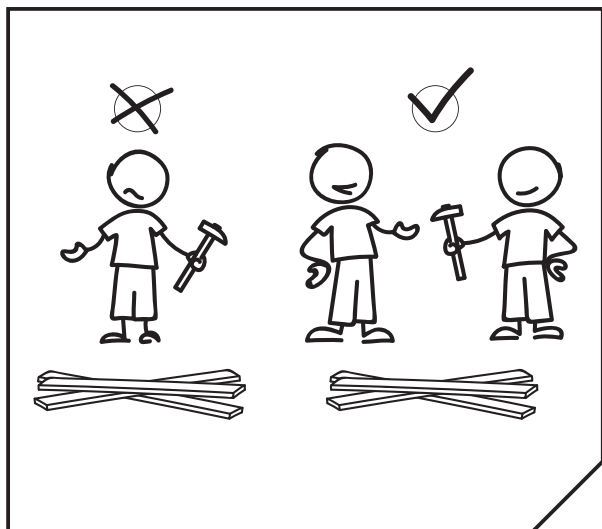


Сборку комплекта строения рекомендуется выполнять в количестве 2-х человек, с привлечением помощника.

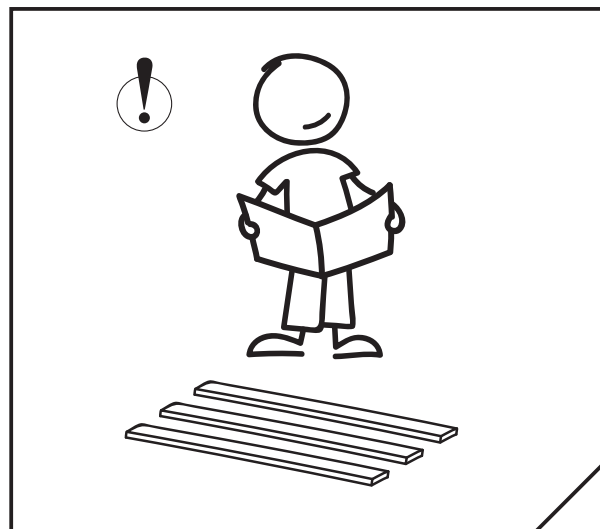

Перед началом сборки необходимо тщательно ознакомиться с Инструкцией.

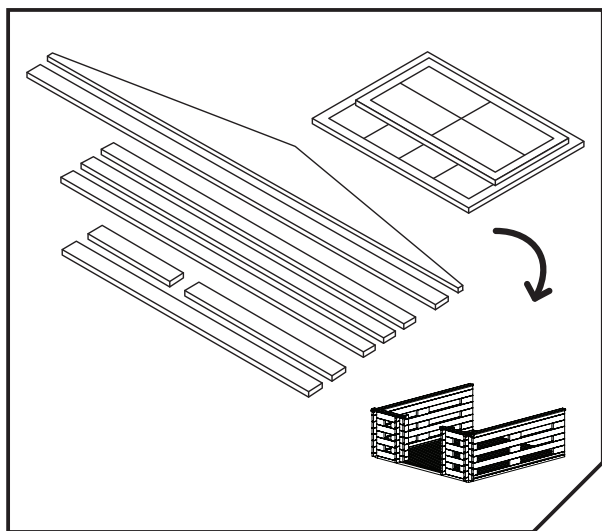

Детали комплекта следует разложить в соответствии со спецификацией по номерам согласно порядку сборки.

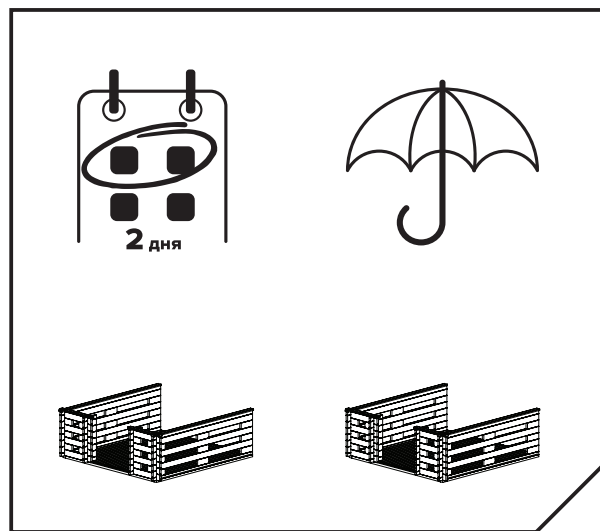

Соберите готовое изделие в течение двух дней после распаковки.

В случае увеличения срока сборки рекомендуется защищать строение от прямого воздействия атмосферных осадков.

Более подробная информация приведена в спецификации продукта.

ФУНДАМЕНТ

В качестве основания строения допускается использовать любой вид фундамента, который будет обеспечивать его надёжность и долговечность: ленточные мелкозаглубленные фундаменты, свайный с деревянным обвязочным ростверком или в виде сплошной плиты.

Комплектом поставки предусмотрены антисептированные элементы каркаса пола (фундаментные балки), которые необходимо закрепить к сплошному основанию (фундаментная плита).

При выборе в качестве основания строения ленточного или свайного фундамента необходимо дополнительно смонтировать несущие конструкции цокольного перекрытия. Рекомендуется применять деревянные доски сечением не менее 50×150 мм, установленные с шагом не более 600 мм вдоль короткой стороны строения. В таком случае доски необходимо обработать антисептирующими составами согласно рекомендациям производителей таких составов.

Строения временного, не ответственного характера допускается монтировать на фундаментные полнотелые цементно-песчаные блоки размером не менее 200×200×400 мм, установленные по периметру стен.

В местах опирания стен строения на фундамент необходимо укладывать гидроизолирующие прокладки в 2 слоя.

Выбор вида фундамента зависит от инженерно-геологических условий строительной площадки. Компания ТЕХНОНИКОЛЬ не несёт ответственности за нарушение конструкции строения из-за некачественного фундамента.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ДЕТАЛЕЙ

№	Наименование	Размеры			Кол-во	Схематичное отображение
		Толщина	Ширина	Длина		
1	Стеновой брус	44	67	2900	2	
2	Стеновой брус (+1 доп.)	44	135	2900	7	
3	Стеновой брус	44	135	900	8	
4	Стеновой брус	44	135	350	30	
5	Стеновой брус	44	135	330	12	
6	Стеновой брус	44	77	2900	2	
7	Стеновой брус	44	67	350	2	
8	Стеновой брус	44	77	350	2	
9	Пол + 1 доп. (2760×2640 мм) 7,5 м²	28	140	2760	20	
10	Фундаментная балка	47	70	2810	2	
11		47	47	2588	6	
12		47	70	2588	2	
13	Плинтус	18	44	2900	4	
14	Поручень	30	88	2900	3	

КРЕПЕЖ

№	Наименование	Итог на 1 комплект	Единица измерения
①	Gwozdeck ТЕРРАСА 5×60 мм коричневый Torx15	320	шт./изд.
②	Саморез стеновой 6×200 мм	91	шт./изд.
③	Саморез 6×120 мм	40	шт./изд.
④	Саморез 5×90 мм	20	шт./изд.

ПРИМЕЧАНИЕ: все метизы должны быть оцинкованы и предназначены для работ по дереву.

ВАЖНО: перед вкручиванием самореза диаметром 6 мм (и более), предварительно просверлить отверстие диаметром 5 мм на глубину, равную гладкой (без резьбы) части стержня самореза. При вкручивании утопить головку самореза в брус на глубину не менее 5 мм.



Gwozdeck
ТЕРРАСА
5×60 мм



Саморез
стеновой
6×200 мм




Саморез
6×120 мм




Саморез
5×90 мм

ПЛАНИРОВКА


ВИД А

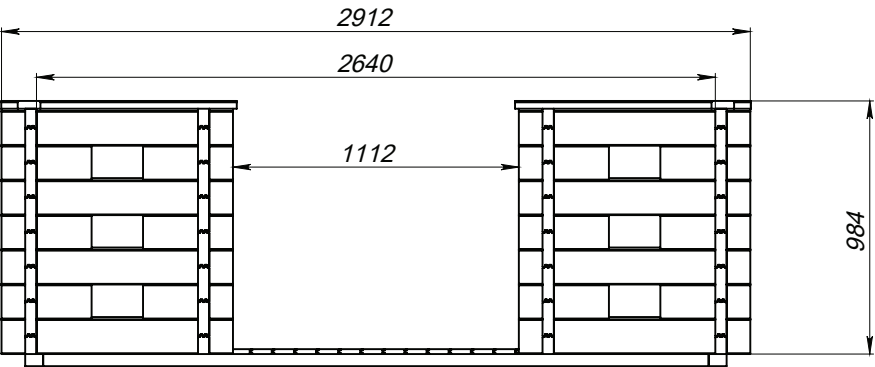

ОБЩИЙ ПЛАН

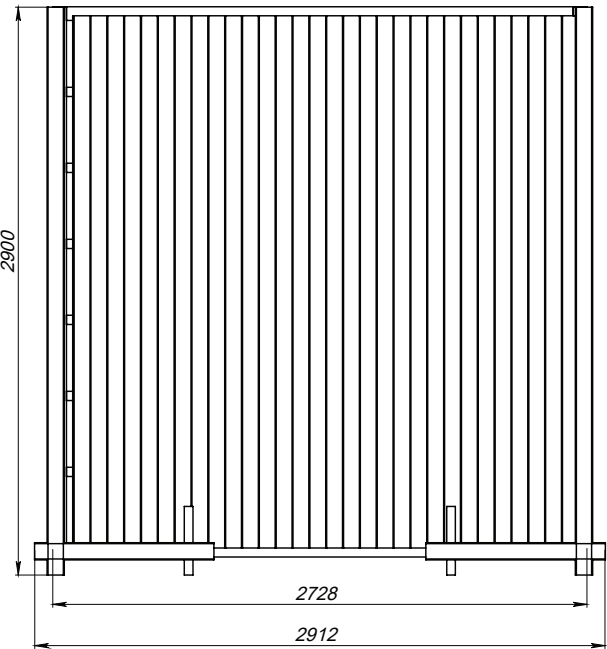

ПЛАН КАРКАСА ПОЛА

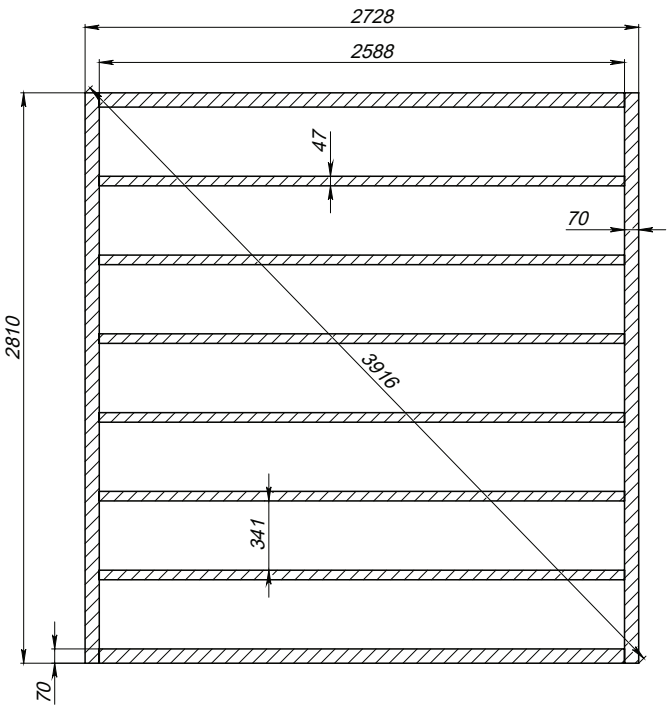


ЭТАПЫ СБОРКИ

1. Сборка каркаса пола

Разложите элементы каркаса пола 10, 11, 12 согласно схеме. Соедините их при помощи саморезов 3.




Проверь диагонали!!!

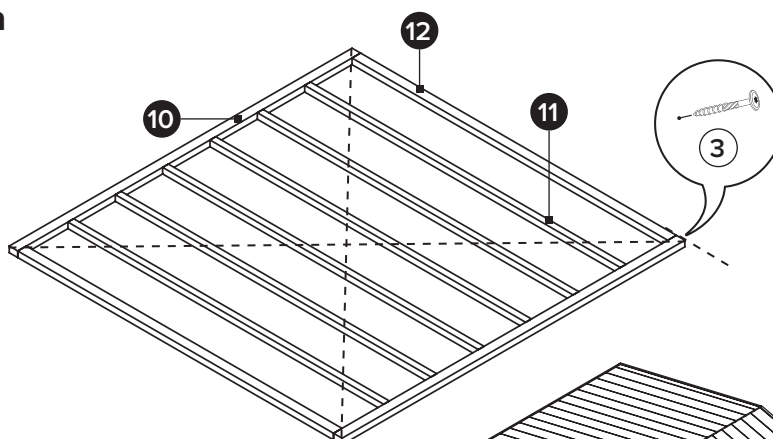


2. Прикрепить каркас пола террасы к фундаменту дома

Под фундаментными балками каркаса пола разместить слой гидроизоляции в виде ленты шириной 100 мм.

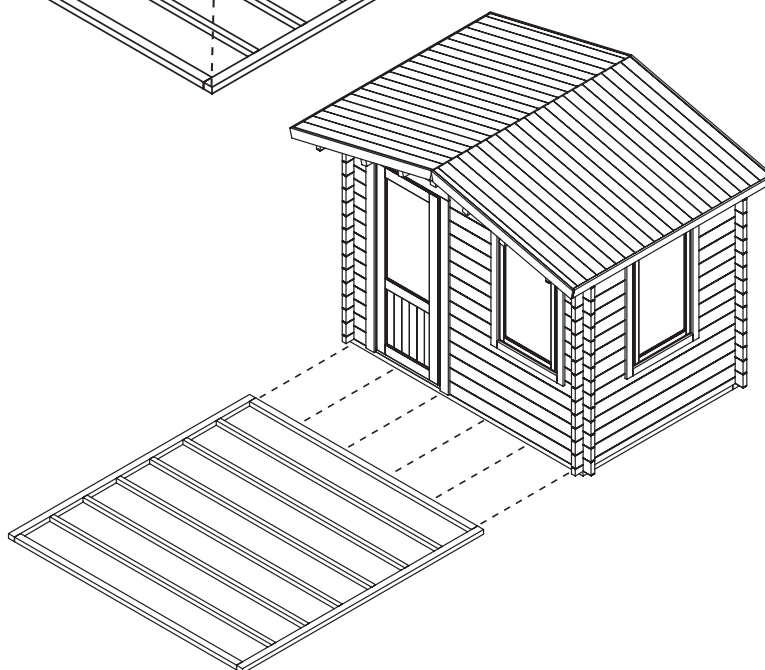

3. Сборка первого ряда венца стен



Соберите элементы первого ряда венца стен на каркасе пола и проверьте диагонали перед фиксацией их к фундаменту. Элементы 1 и 7 крепим саморезами 3, а элемент 3 саморезами 2. Два самореза ставим по краям детали на расстоянии 250 мм от переруба. Далее с шагом не более 1 м.

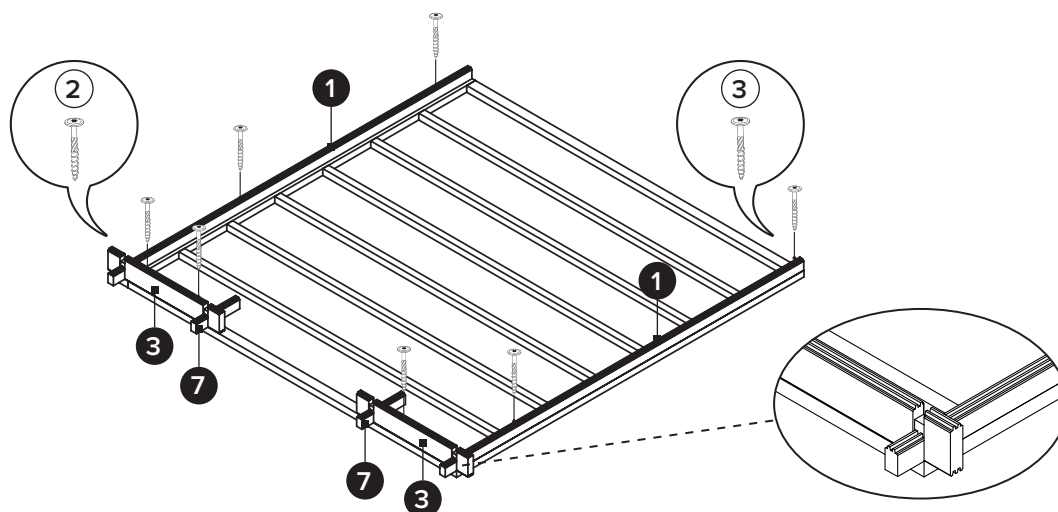

4. Монтаж последующих венцов стен


Каждый ряд (венец) стен строения, начиная со второго, крепить саморезами ②.

Шляпки саморезов необходимо утапливать минимум на 5 мм

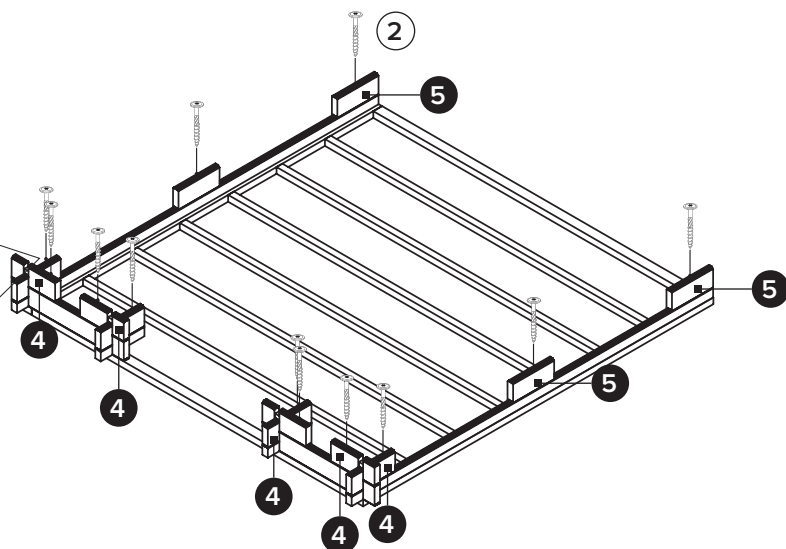


5.

По этим схемам собираем 7 венцов стен.

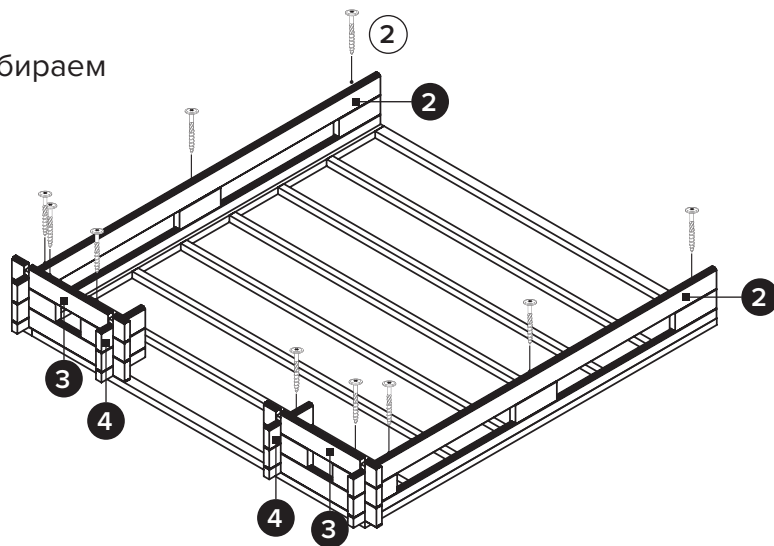


6.

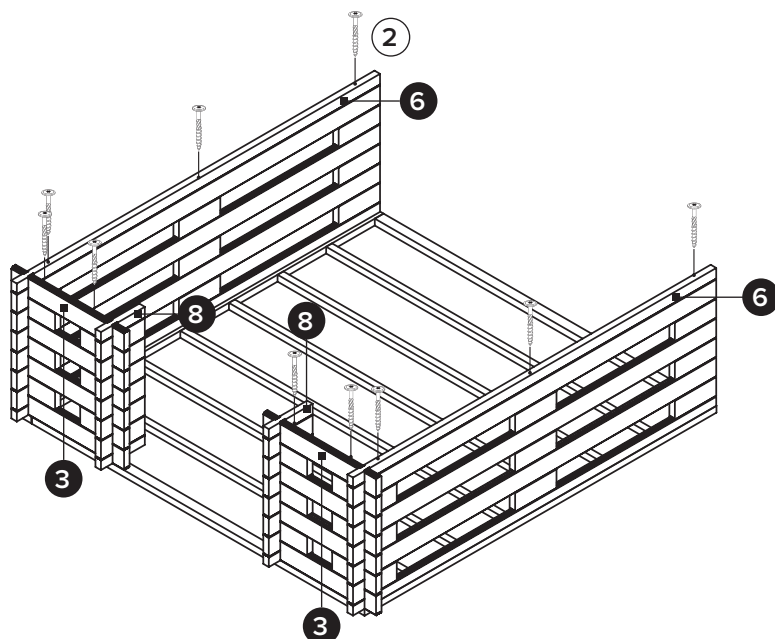




7. Установка поручней

Прикрепить поверх стен ограждения террасы поручни при помощи саморезов ④ согласно схеме с шагом не менее 350 мм.

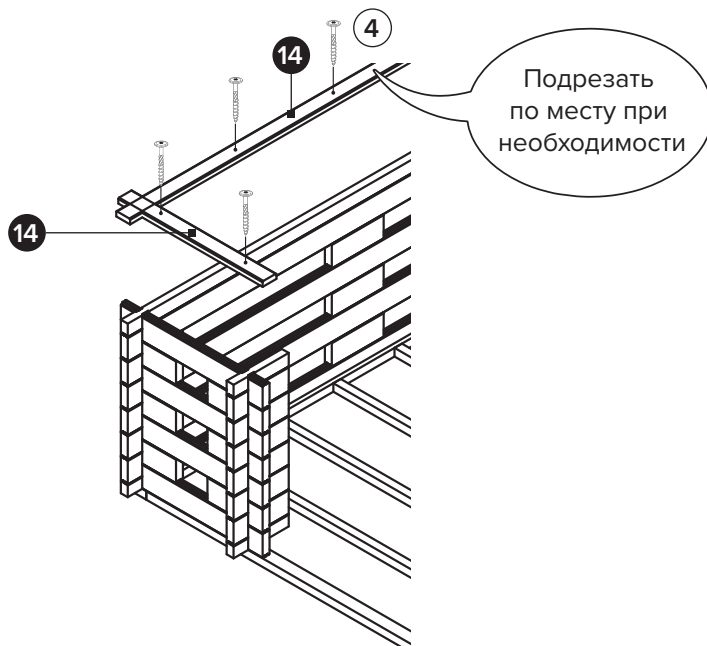


8. Крепление настила пола к лагам

Террасную доску настила монтировать с зазором 5–8 мм. В местах примыкания настила пола к стенам, перерубам, предусмотреть зазор не менее 5 мм.

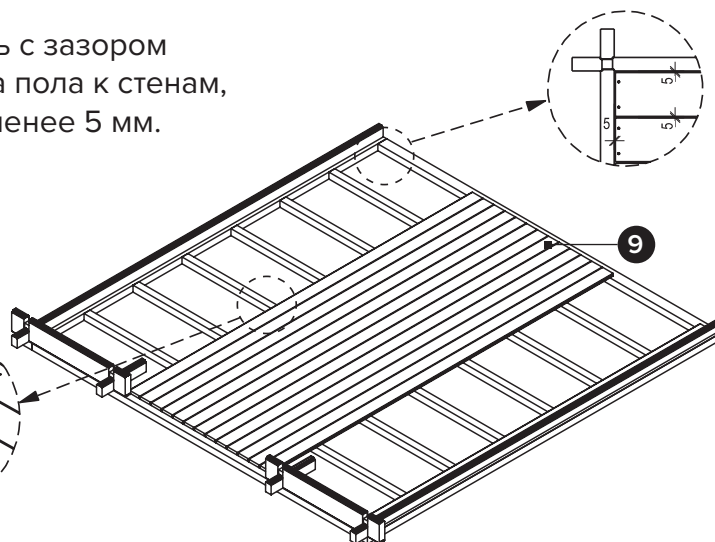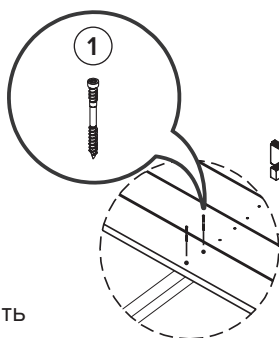

По желанию смонтировать плинтус ⑬ по периметру стен террасы. В местах стыка плинтуса в углах выполнить подрезку под углом $45 \pm 1^\circ$.

9. Готовый вид

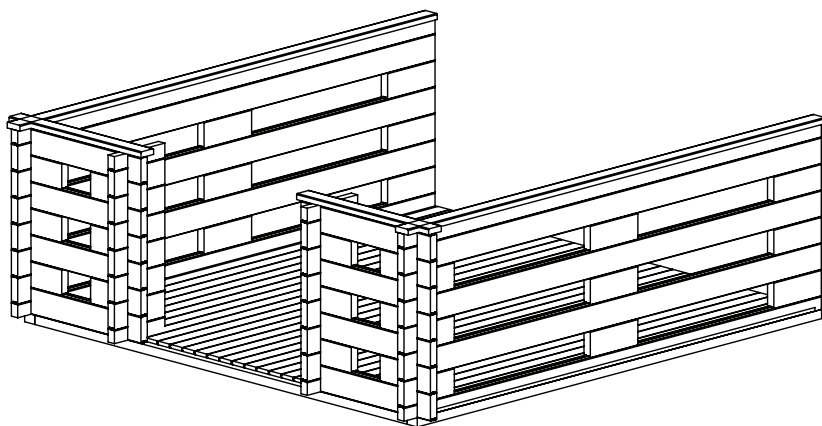

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАБОТКЕ



После полной сборки строения следует устранить длительное или периодическое увлажнение древесины путём её защиты от биоразрушения. Обработайте продукт в течение 7 календарных дней.

Для защиты деревянных стен снаружи строения допускается применять специальные составы на основе натуральных масел и восков, а также плёнкообразующие лакокрасочные покрытия на водной или акриловой основе, которые защищают древесину от увлажнения атмосферными осадками и воздействия УФ-излучения.



Производитель оставляет за собой право в любое время, без предварительного уведомления, вносить изменения в оборудование, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на качество продукции.

